



MANAŽÉR
ŽELEZNIČNEJ
INFRAŠTRUKTÚRY

Obmedzenia na železničnej infraštruktúre v správe ŽSR v GVD 2022/2023

Generálne riaditeľstvo ŽSR
Bc. Milan Kubiček
Námestník GR ŽSR pre prevádzku


Modernizácia koridoru – 2021 - 2027

- ŽSR od roku 2021 realizujú modernizačné práce financované prevažne z fondov EÚ, počas trvania GVD 2022/2023 plánujú pokračovať v ich realizácii.
- Zdrojom je OPII 2014-2020 a Nástroj CEF.
- Plán obnovy a odolnosti 2021 – 2026 (24.09.2021 schválený zákon č. 368/2021 Z. z. o Mechanizme na podporu obnovy a odolnosti upravujúci finančné vzťahy)
- Operačný program Slovensko 2021 – 2027 (n+2;2029) a CEF2

Plánované výluky dobeh GVD 2021/2022 a nové výluky v GVD 2022/2023 (investície z OPII, CEF)

Modernizácia trate v úseku Čadca – štátna hranica ČR:


- vylúčená 2. TK Čadca – štátna hranica ČR **od 31.10.2022 do 18.06.2023 a od 01.12.2023 do 31.12.2023**
- vylúčená 1. TK Čadca – štátna hranica ČR **od 24.06.2023 do 25.11.2023**
- vypnuté traťové zabezpečovacie zariadenie v úseku Čadca – štátna hranica ČR **od 19.06.2023 do 23.06.2023 a od 26.11.2023 do 30.11.2023**

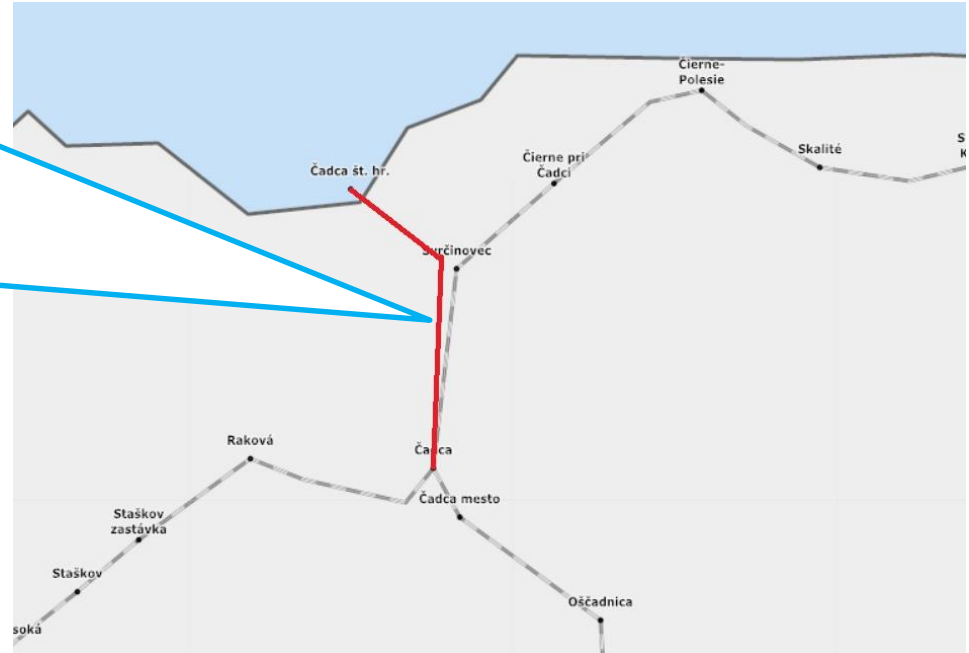

Plánované výluky dobeh GVD 2021/2022 a nové výluky v GVD 2022/2023 (investície z OPII, CEF)

Oprava priepustu v km 131,496 v
ŽST Margecany:

- vylúčená 2. koľaj v ŽST Margecany **od 9. do 22. týždňa (marec – máj) 2023**
- vylúčená 1. koľaj v ŽST Margecany **od 23. do 35. týždňa (jún – august) 2023**

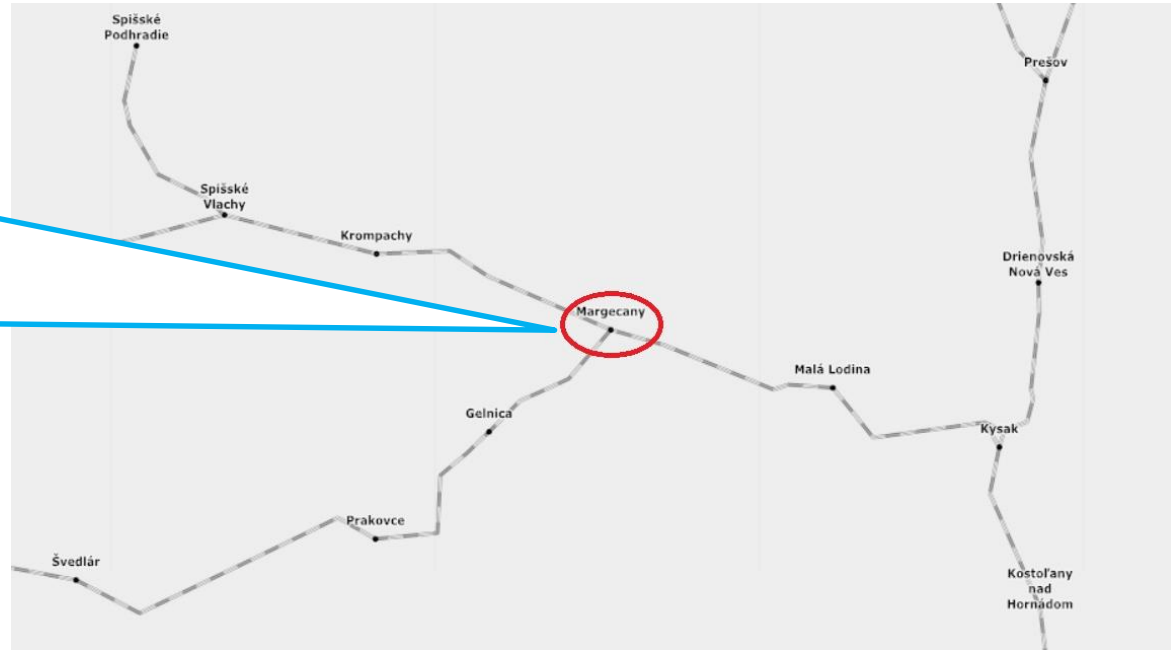


Plánované výluky dobeh GVD 2021/2022 a nové výluky v GVD 2022/2023 (investície z OPII, CEF)

Obnova koľajového lôžka koľaje
a súvislá výmena koľajnicových pásov
v úseku ŽST Nová Baňa – Žarnovica
v termíne **od 17.05.2023 do
31.05.2023** – zavedená NAD




Plánované výluky dobeh GVD 2021/2022 a nové výluky v GVD 2022/2023 (investície z OPII, CEF)

Komplexná rekonštrukcia železničného zvršku v úseku Hronský Beňadik - Nová Baňa a v ŽST Hronský Beňadik v termíne **od 01.06.2023 do 31.12.2023** – zavedená NAD

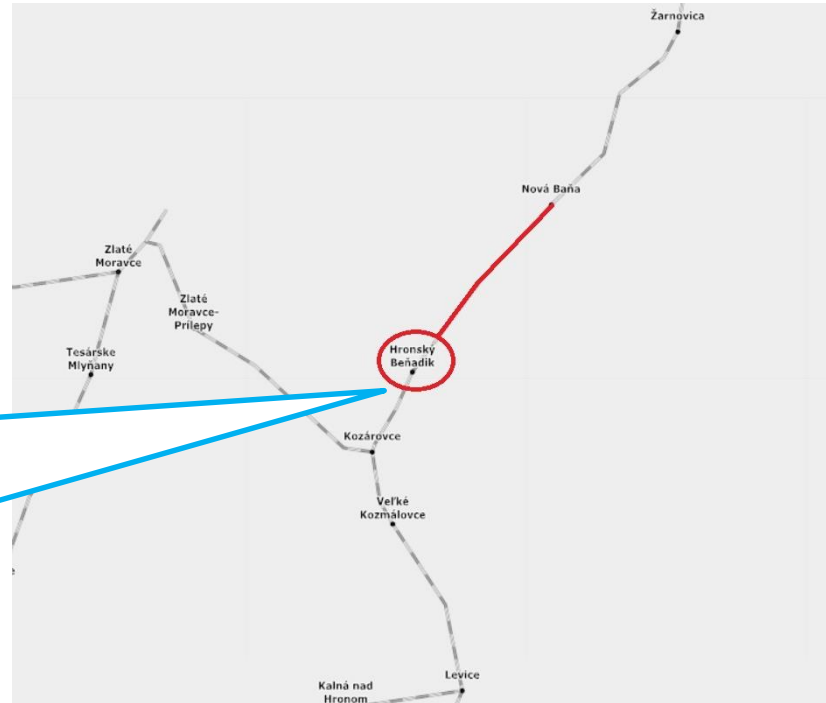

Plánované výluky dobeh GVD 2021/2022 a nové výluky v GVD 2022/2023 (investície z OPII, CEF)


Komplexná rekonštrukcia 2. traťovej
koľaje v úseku ŽST Palárikovo - Nové
Zámky v termíne **od 09.01.2023 do
25.05.2023**

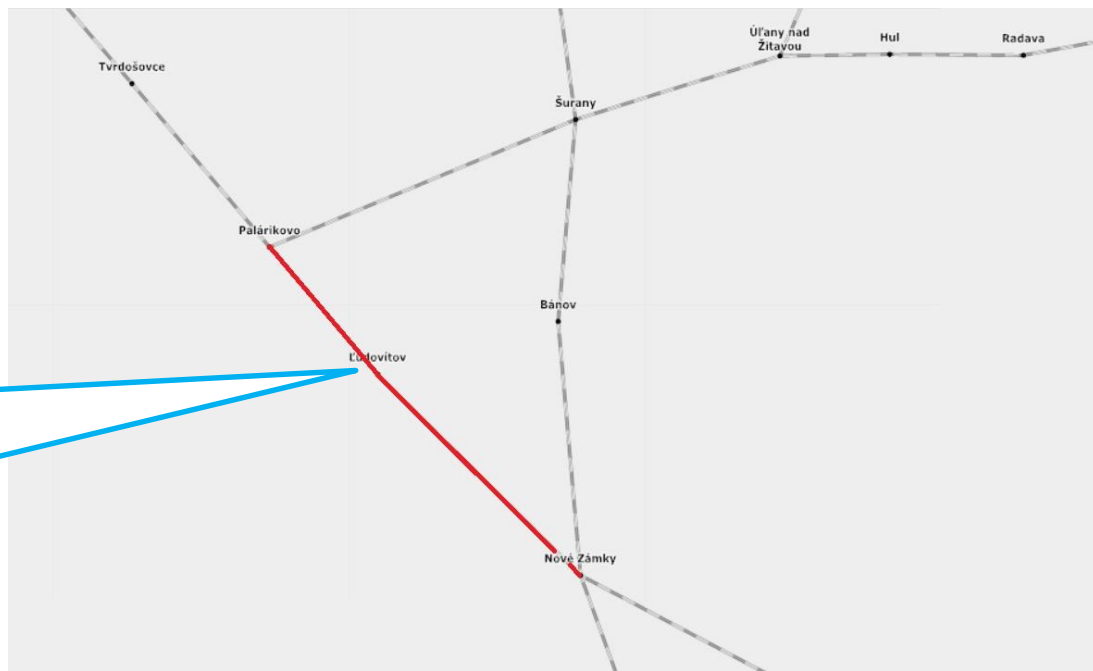

Plánované výluky dobeh GVD 2021/2022 a nové výluky v GVD 2022/2023 (investície z OPII, CEF)


Komplexná rekonštrukcia 2. traťovej
koľaje v úseku ŽST Trnovec nad
Váhom - Tvrdošovce v termíne
od 01.02.2023 do 09.07.2023

Komplexná rekonštrukcia 1. traťovej
koľaje v úseku ŽST Trnovec nad
Váhom - Tvrdošovce v termíne
od 10.07.2023 do 30.11.2023

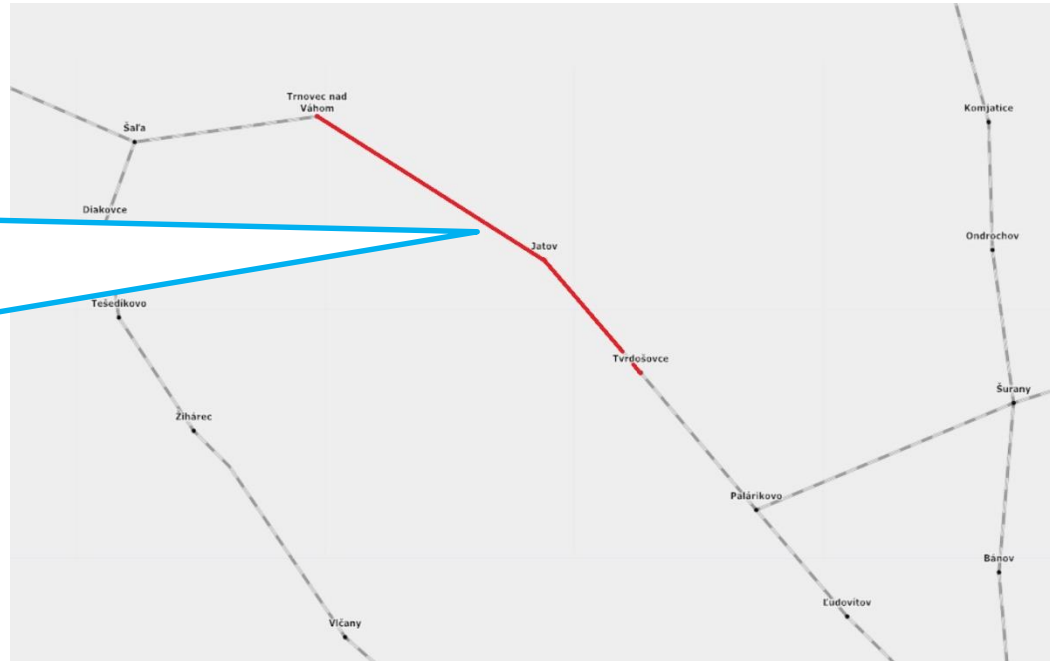

Plánované výluky dobeh GVD 2021/2022 a nové výluky v GVD 2022/2023 (investície z OPII, CEF)


Komplexná rekonštrukcia
tunela č. 2 v ŽST Bratislava
hlavná stanica v termíne
od 25.08.2022 do 11.05.2023

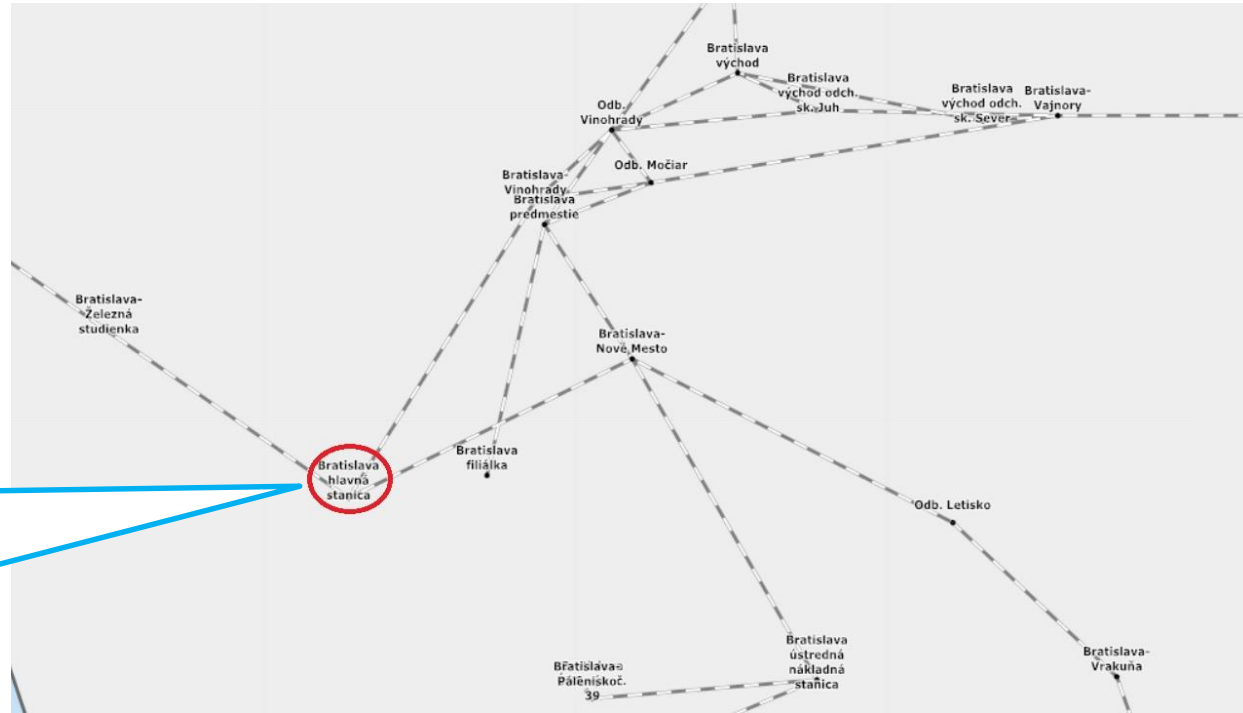

Plánované výluky dobeh GVD 2021/2022 a nové výluky v GVD 2022/2023 (investície z OPII, CEF)


Modernizácia železničného zvršku a trakčného vedenia nepárnej skupiny koľají a dobudovanie nástupišťa a podchodu pre cestujúcich v ŽST Zohor v mesiacoch **máj – september 2023**

Modernizácia železničného zvršku a trakčného vedenia párnej skupiny koľají a dobudovanie nástupišťa a podchodu pre cestujúcich v ŽST Zohor v mesiacoch **október – december 2023**

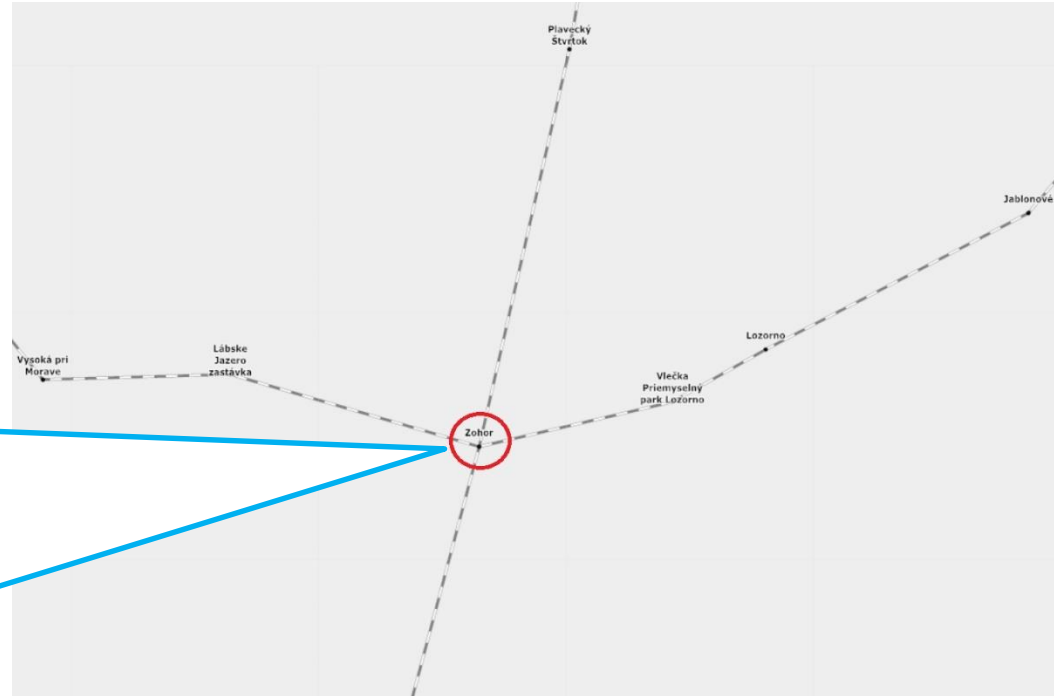


Plánované výluky dobeh GVD 2021/2022 a nové výluky v GVD 2022/2023 (investície z OPII, CEF)

Modernizácia železničného zvršku a trakčného vedenia 2. traťovej koľaje v úseku ŽST Zohor – Malacky v mesiacoch **október – december 2023**

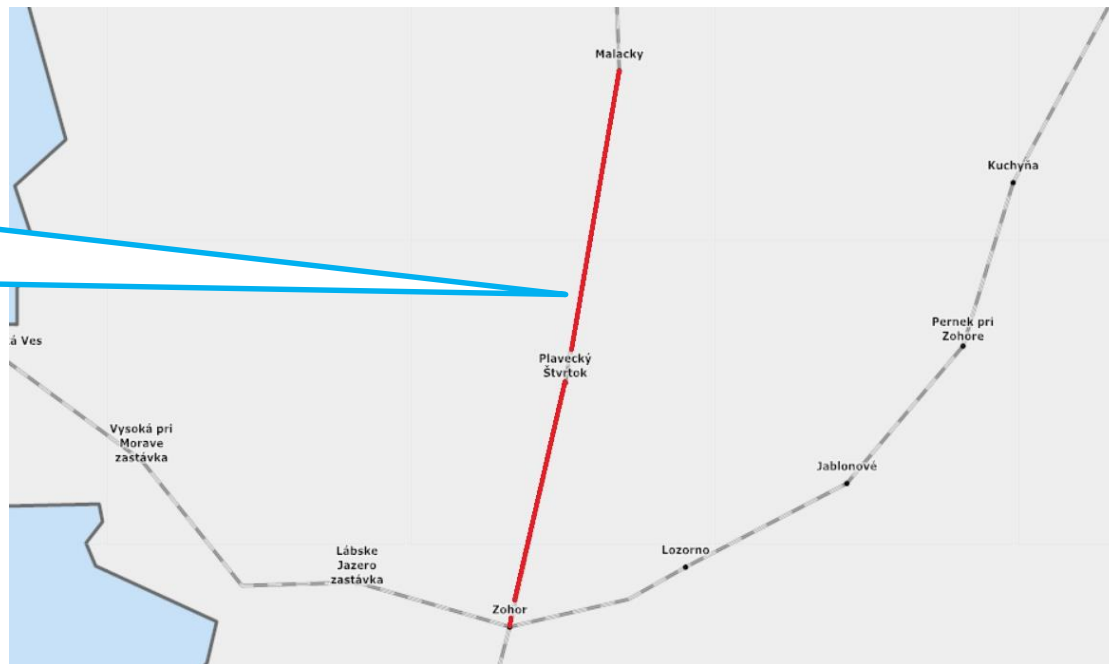


Plánované výluky dobeh GVD 2021/2022 a nové výluky v GVD 2022/2023 (investície z OPII, CEF)

Modernizácia železničného zvršku a trakčného vedenia nepárnej skupiny koľají a dobudovanie nástupišta a podchodu pre cestujúcich v ŽST Malacky v mesiacoch **október – december 2023**

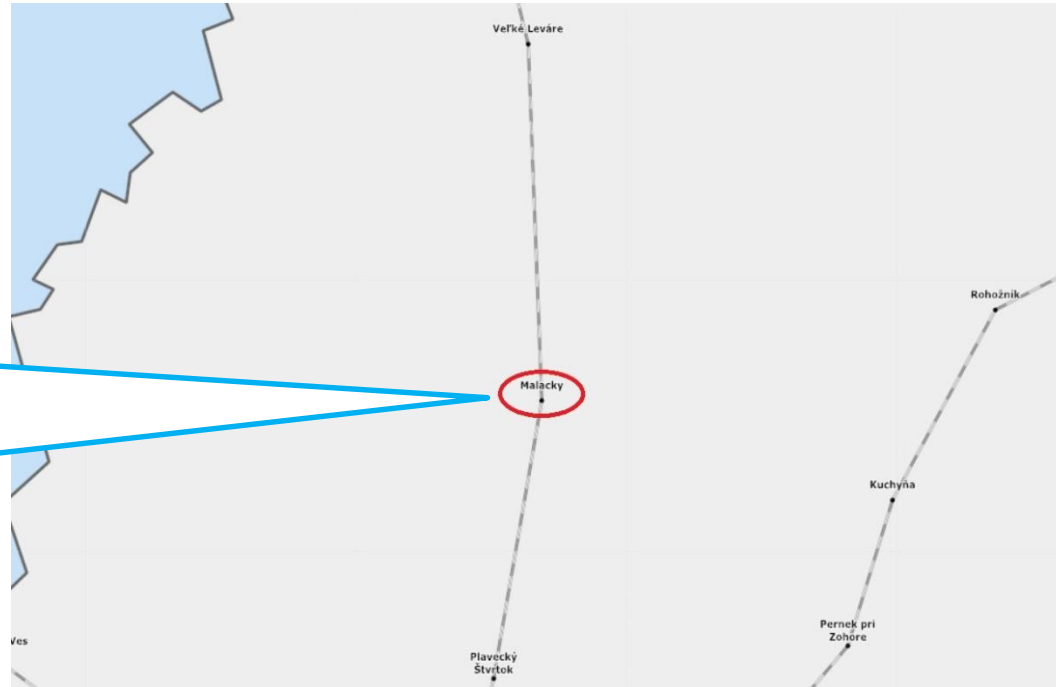

Plánované výluky dobeh GVD 2021/2022 a nové výluky v GVD 2022/2023 (investície z OPII, CEF)


Obnova koľajového lôžka výhybiek
a koľají v ŽST Bratislava Nové Mesto
v termíne **od 14. do 25. týždňa (apríl -
jún 2023)**

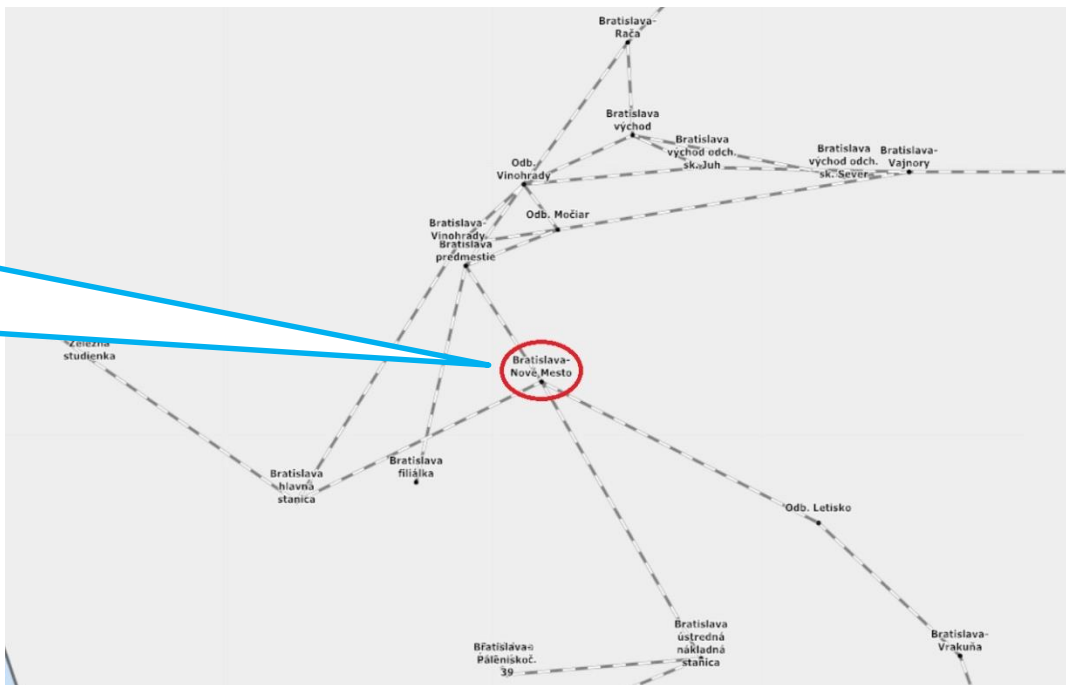

Plánované výluky dobeh GVD 2021/2022 a nové výluky v GVD 2022/2023 (investície z OPII, CEF)

Modernizácia 1. traťovej koľaje
v úseku Výhybňa Lučivná - ŽST Svit
od 01.03.2023 do 13.07.2023

Modernizácia 2. traťovej koľaje
v úseku Výhybňa Lučivná - ŽST Svit
od 14.07.2023 do 30.11.2023

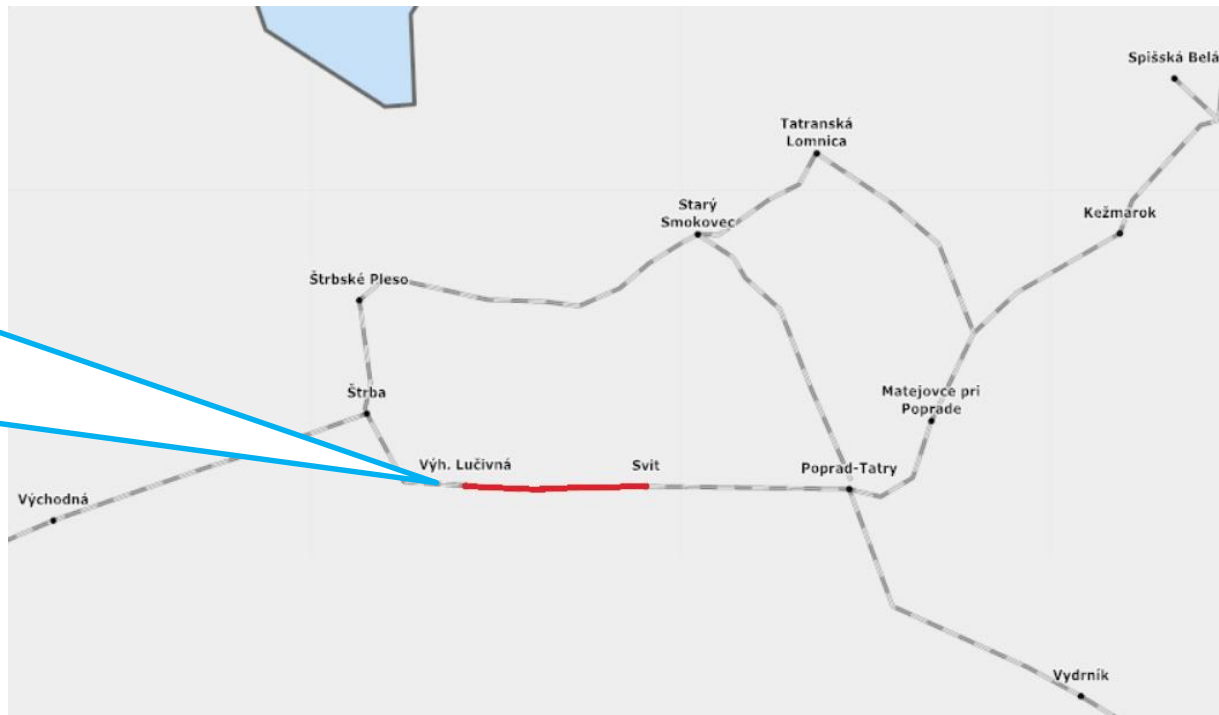

Plánované výluky dobeh GVD 2021/2022 a nové výluky v GVD 2022/2023 (investície z OPII, CEF)


Modernizácia uzla Žilina (Varín - Odbočka Váh - Žilina - Žilina zriaďovacia stanica) - jednokoľajná prevádzka v niektorom z **medzistaničných úsekov, výluky párnych a nepárnych skupín koľají** podľa harmonogramu zhotoviteľa stavby po celý rok 2022 (výhľad ukončenia prác v roku 2024)



Plánované výluky dobeh GVD 2021/2022 a nové výluky v GVD 2022/2023 (investície z OPII, CEF)

Modernizácia koridoru č. IV – Devínska
Nová Ves – Kúty št. hr.:

- prebiehajúce stavebné práce na úseku **Kúty – štátna hranica ČR**
- **od 29.08.2022 do 18.09.2023** jednokoľajná prevádzka odchod Kúty 2. TK – príchod Lanžhot 1. TK
- **od 01/2023 9x4 bloky, 5x So/Ne bloky 8 h, 20 x nočné ničkoľajka**
- **rušenie „esíčka“ 15-18.09. 2023, opačné „esíčko“ 06-10.10.-2023**
- **od 06.10.2023 do 31.12.2023** jednokoľajná prevádzka odchod Kúty 1. TK – Lanžhot príchod 2. TK

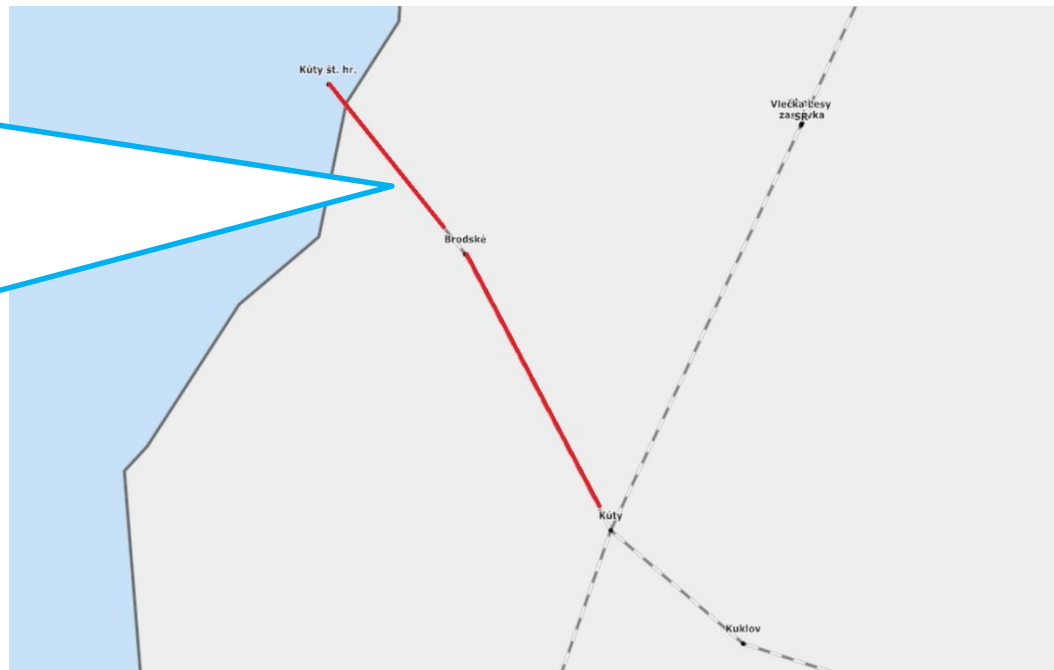

Plánované výluky dobeh GVD 2021/2022 a nové výluky v GVD 2022/2023 (investície z OPII, CEF)

Elektrifikácia trate **Haniska pri Košiciach – Moldava nad Bodvou** so súvisiacimi traťovými úpravami.


Od 02.03.2023 do 15.12.2023 budú vylúčené podľa harmonogramu prác striedavo v denných a nepretržitých výlukách úseky Haniska pri Košiciach - Veľká Ida - Čečejevce - Moldava nad Bodvou



Elektrifikácia úseku Devínska Nová Ves - Marchegg št. hr. - informácia

Rekonštrukcia + elektrifikácia úseku Devínska Nová Ves – št. hranica SK/AT:

- cieľom je obnova tehlovej časti mostného objektu ponad rieku Morava a zlepšenie parametrov ŽI (22,5 t/ os, v = 120 km/h)
- Komplexná rekonštrukcia železničného zvršku úseku Devínska Nová Ves – štátna hranica SK/AT a zvýšenie rýchlosti na v = 120 km/h
- elektrifikácia trate
- predpoklad uzavretia ZoD 10-11/2023
- Realizácia do 07-09/2024
- ŽSR zároveň spracovali Štúdiu realizovateľnosti na zdvojkolajnenie, ďalším krokom je proces EIA

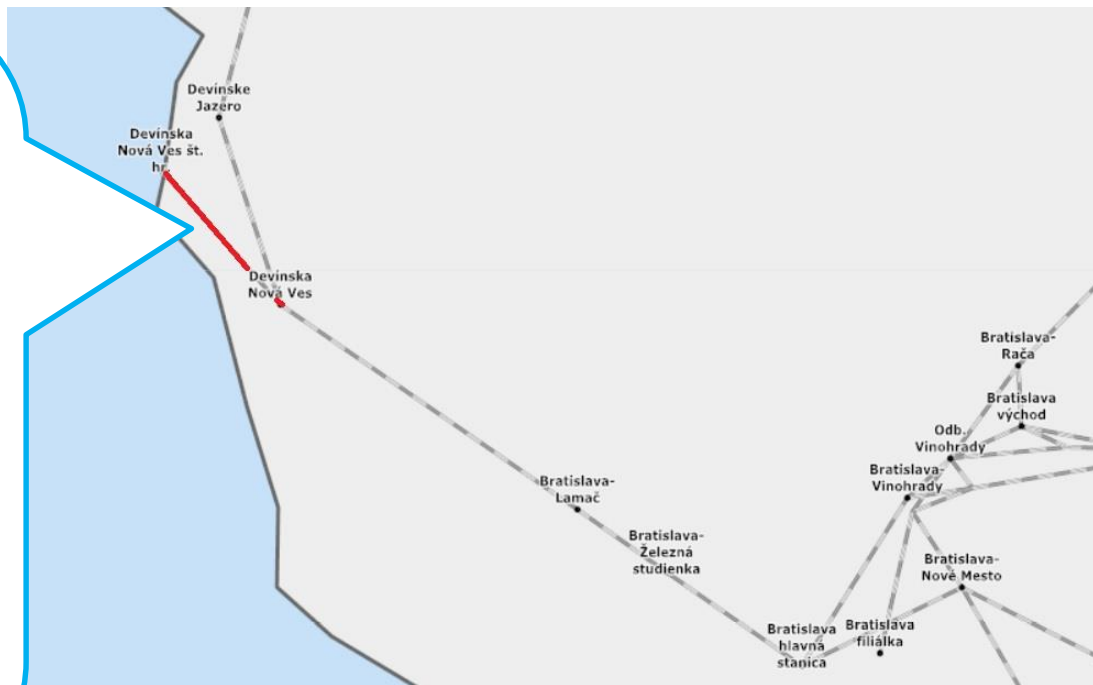

Plánované výluky v GVD 2022/2023 – web portál ŽSR

Ročný plán výlukovej činnosti rozdelený podľa jednotlivých OR je publikovaný na web portáli ŽSR:

<https://www.zsr.sk/dopravcovia/vyluky/>

Foto zo stavieb

UČS 403 Svit - Štrba

SO 403-32-02 Svit-Štrba, železničný spodok

- Budovanie vrstiev násypu preložky trate pri opore č. 1, odkop po úroveň zemnej pláne v mieste napojenia pôvodného telesa na preložku



SO 17-32-03 ŽST Moldava, nástupištia

- Zriadenie zámkovej dlažby nástupištia č. 1
- Osadenie obrubníkov
- Rozoberanie nástupištia č. 2
- Ťaženie zeminý nástupištia č. 2



SO 12-32-01 Kúty - št. hranica SR/ČR, železničný zvršok

- Spoločnosť TSS GRADE vykonala demontáž a odvoz koľajového roštu y 2.TK v úseku od „S“ prepojenia po most v km 74,386
- V dňoch 26.08.2022 až 28.08.2022 bolo vykonané vybudovanie S-prepojenia v zmysle schválených technologických postupov. 28.08.2022 bola vykonaná odovzdávka železničného zvršku
- Spoločnosť TSS GRADE vykonala demontáž a odvoz koľajového roštu y 2.TK v úseku





Ďakujem za pozornosť!
