Stretnutie so zákazníkmi ZSSK Cargo 2026


Bratislava 2026

Odbor dopravy GR ŽSR

Dopravcovia na sieti ŽSR: 50


Iba osobná doprava: 5

Iba nákladná doprava: 40

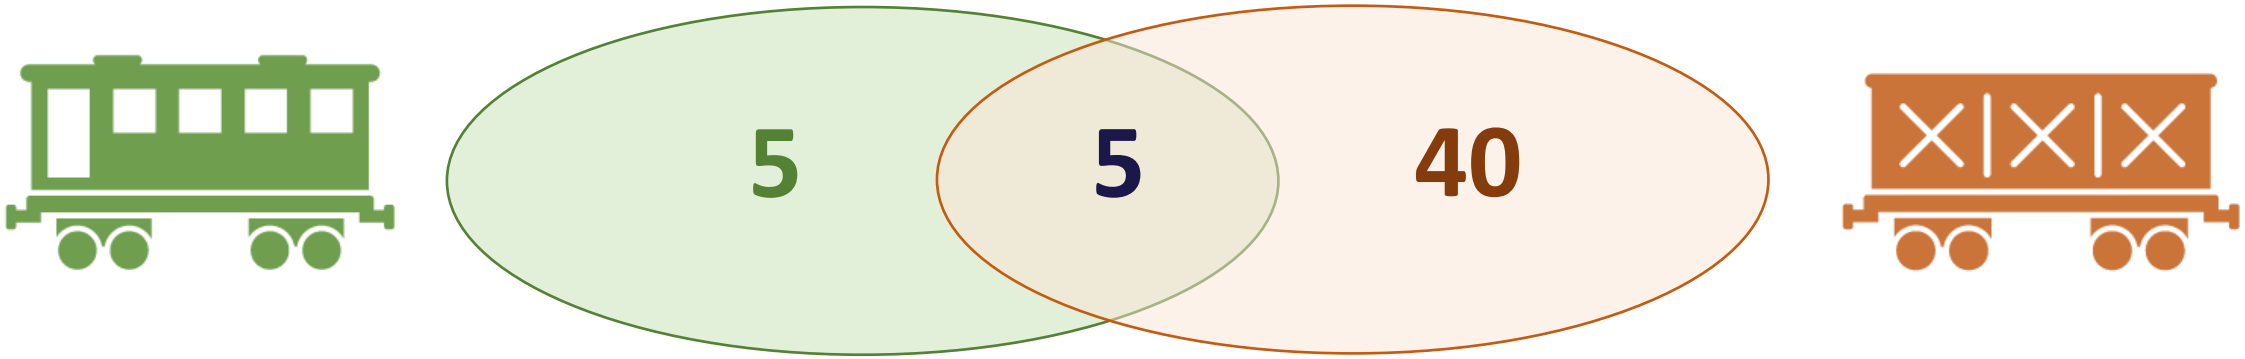

osobná + nákladná doprava: 5

Výkony v osobnej doprave

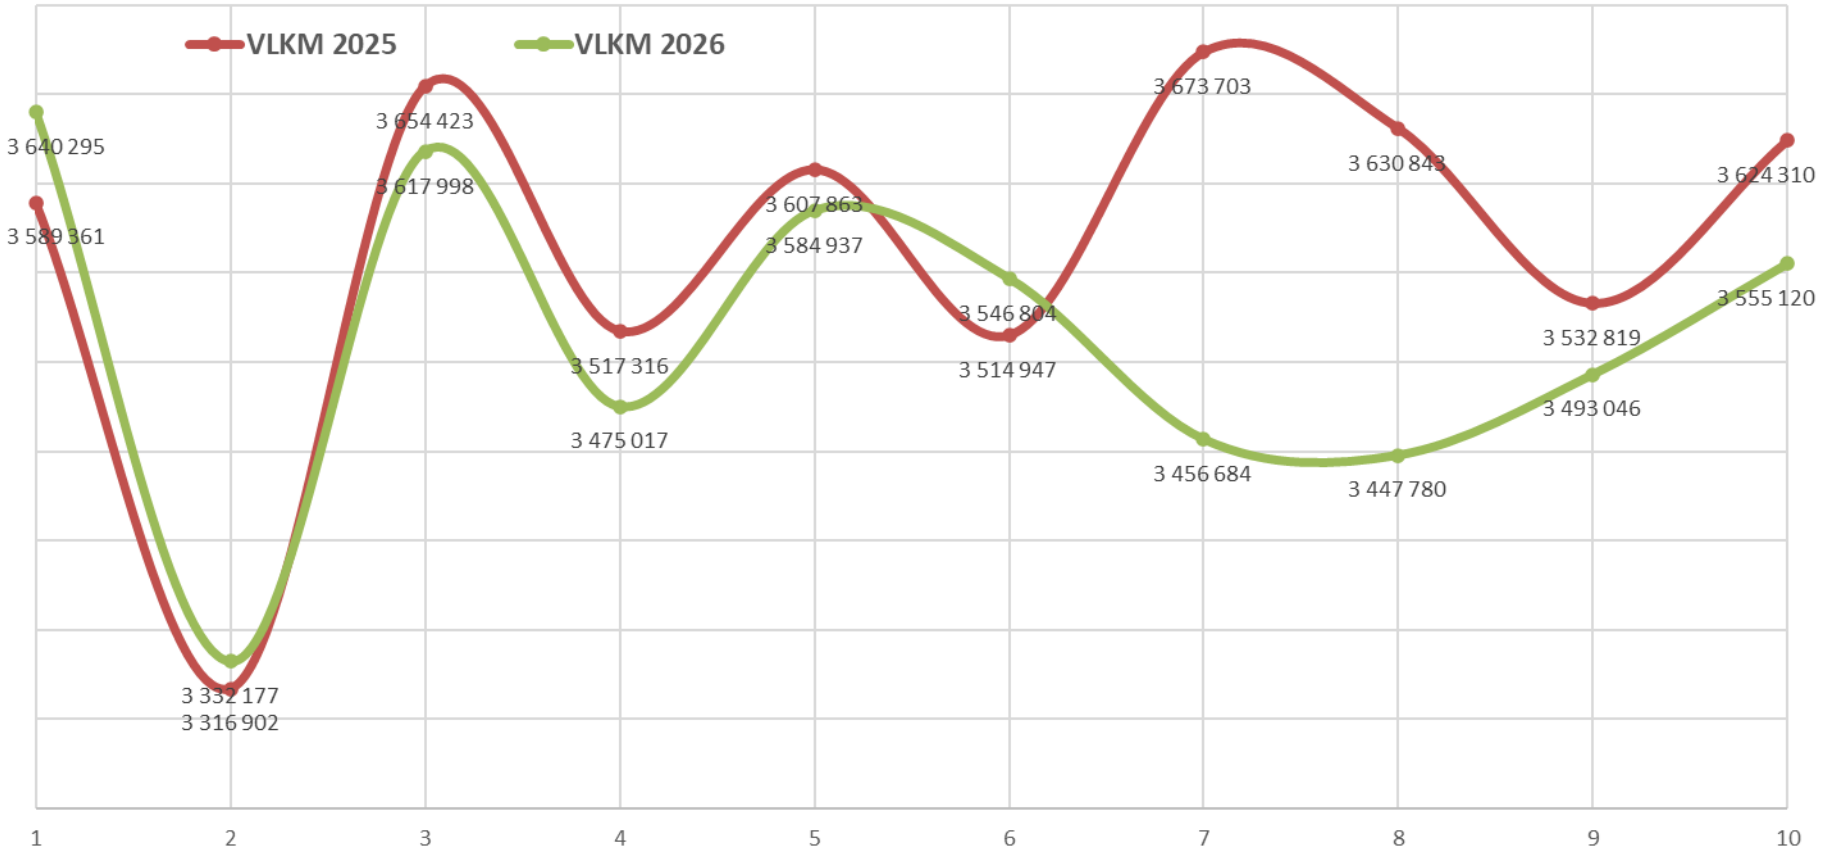


VLKM: -1%


HRTKM: 0%

VLAKY: -2%

Výkony v osobnej doprave

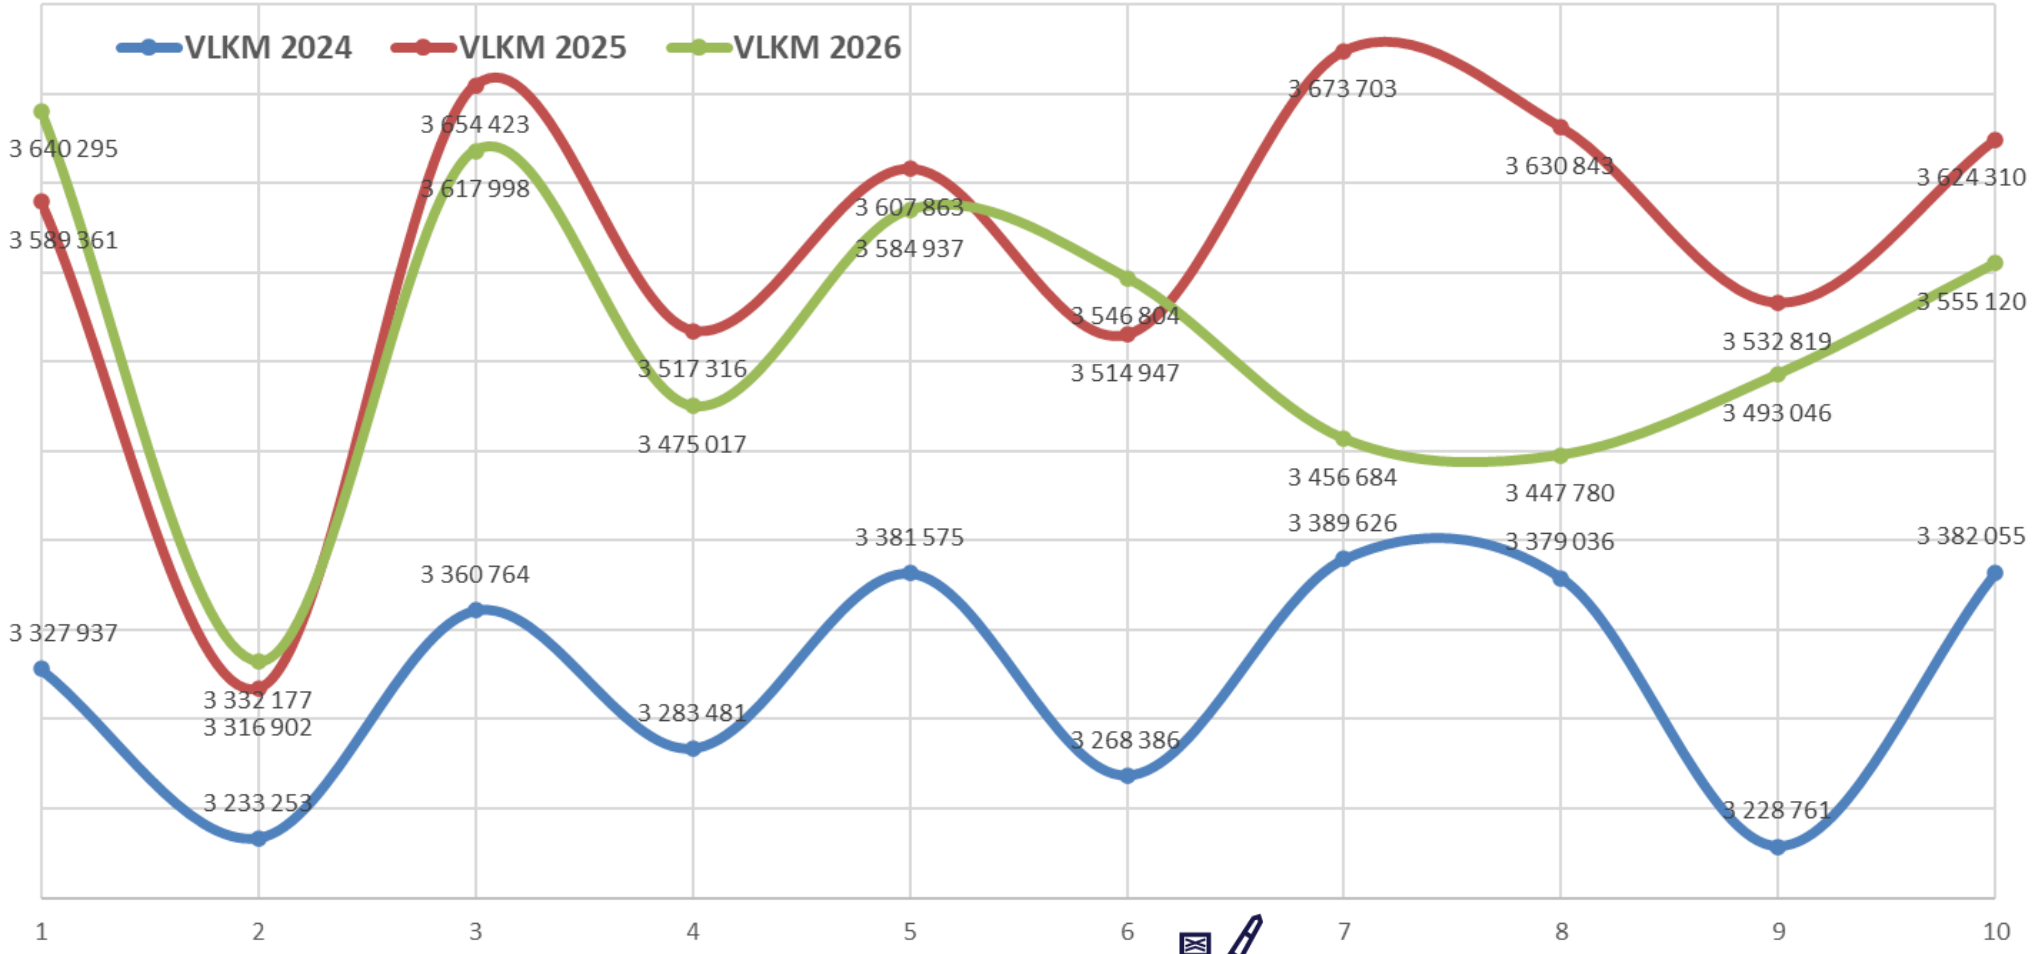

Výkony v nákladnej doprave

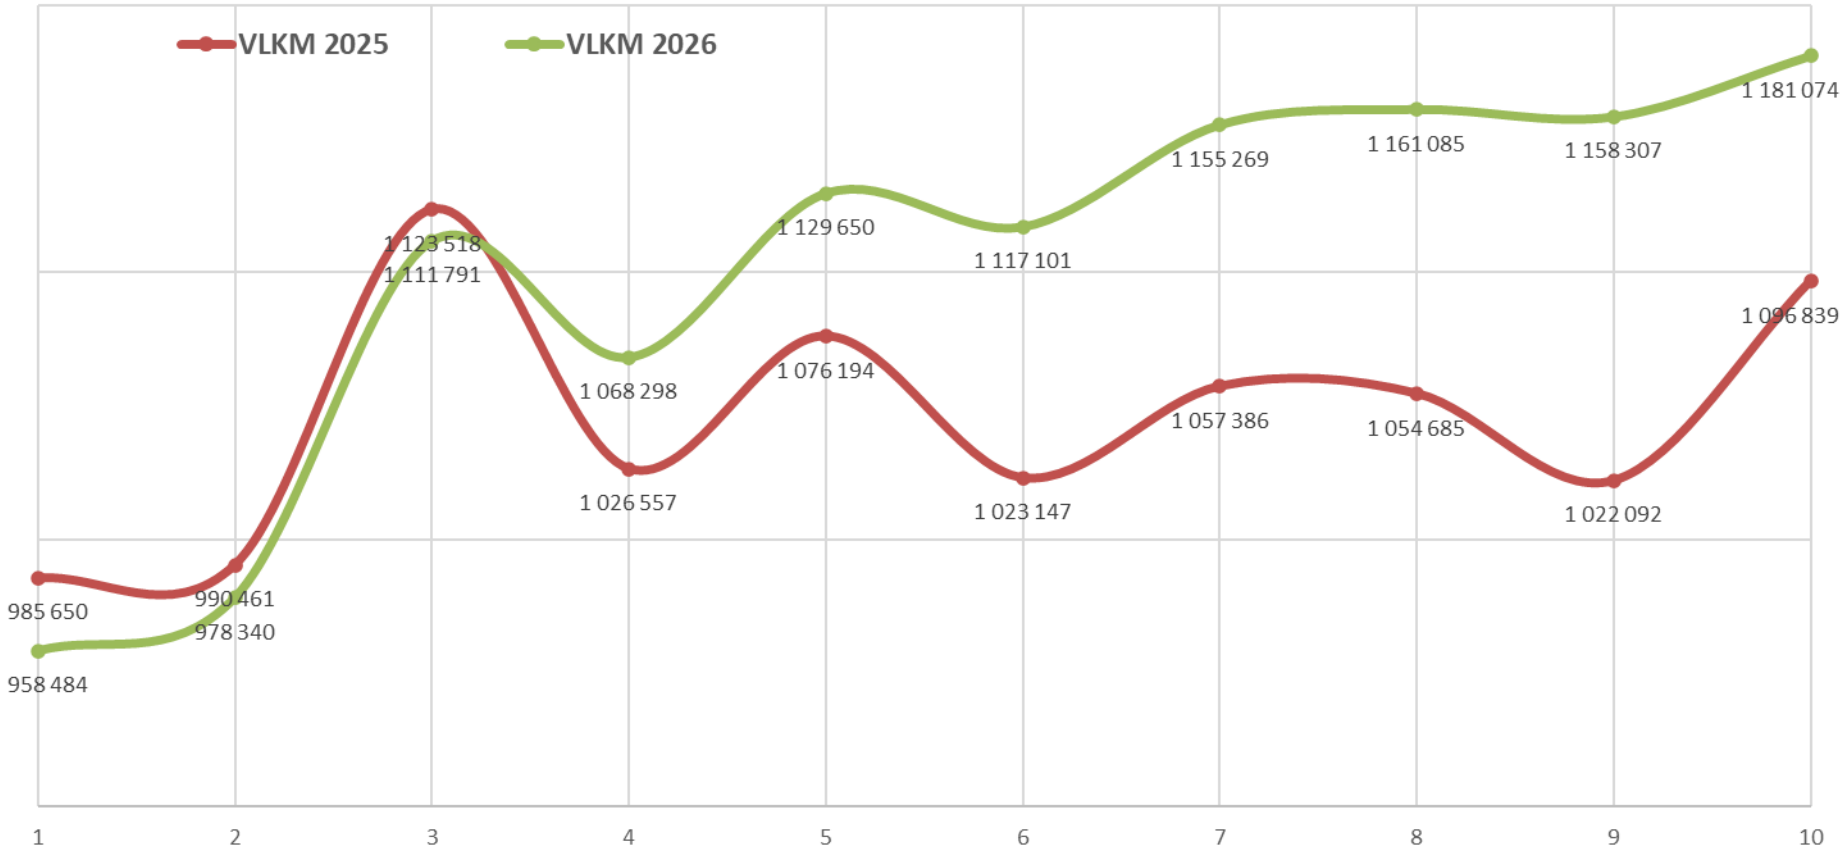

VLKM: +5%


HRTKM: +5%

VLAKY: +2%

Výkony v nákladnej doprave




Výkony v nákladnej doprave

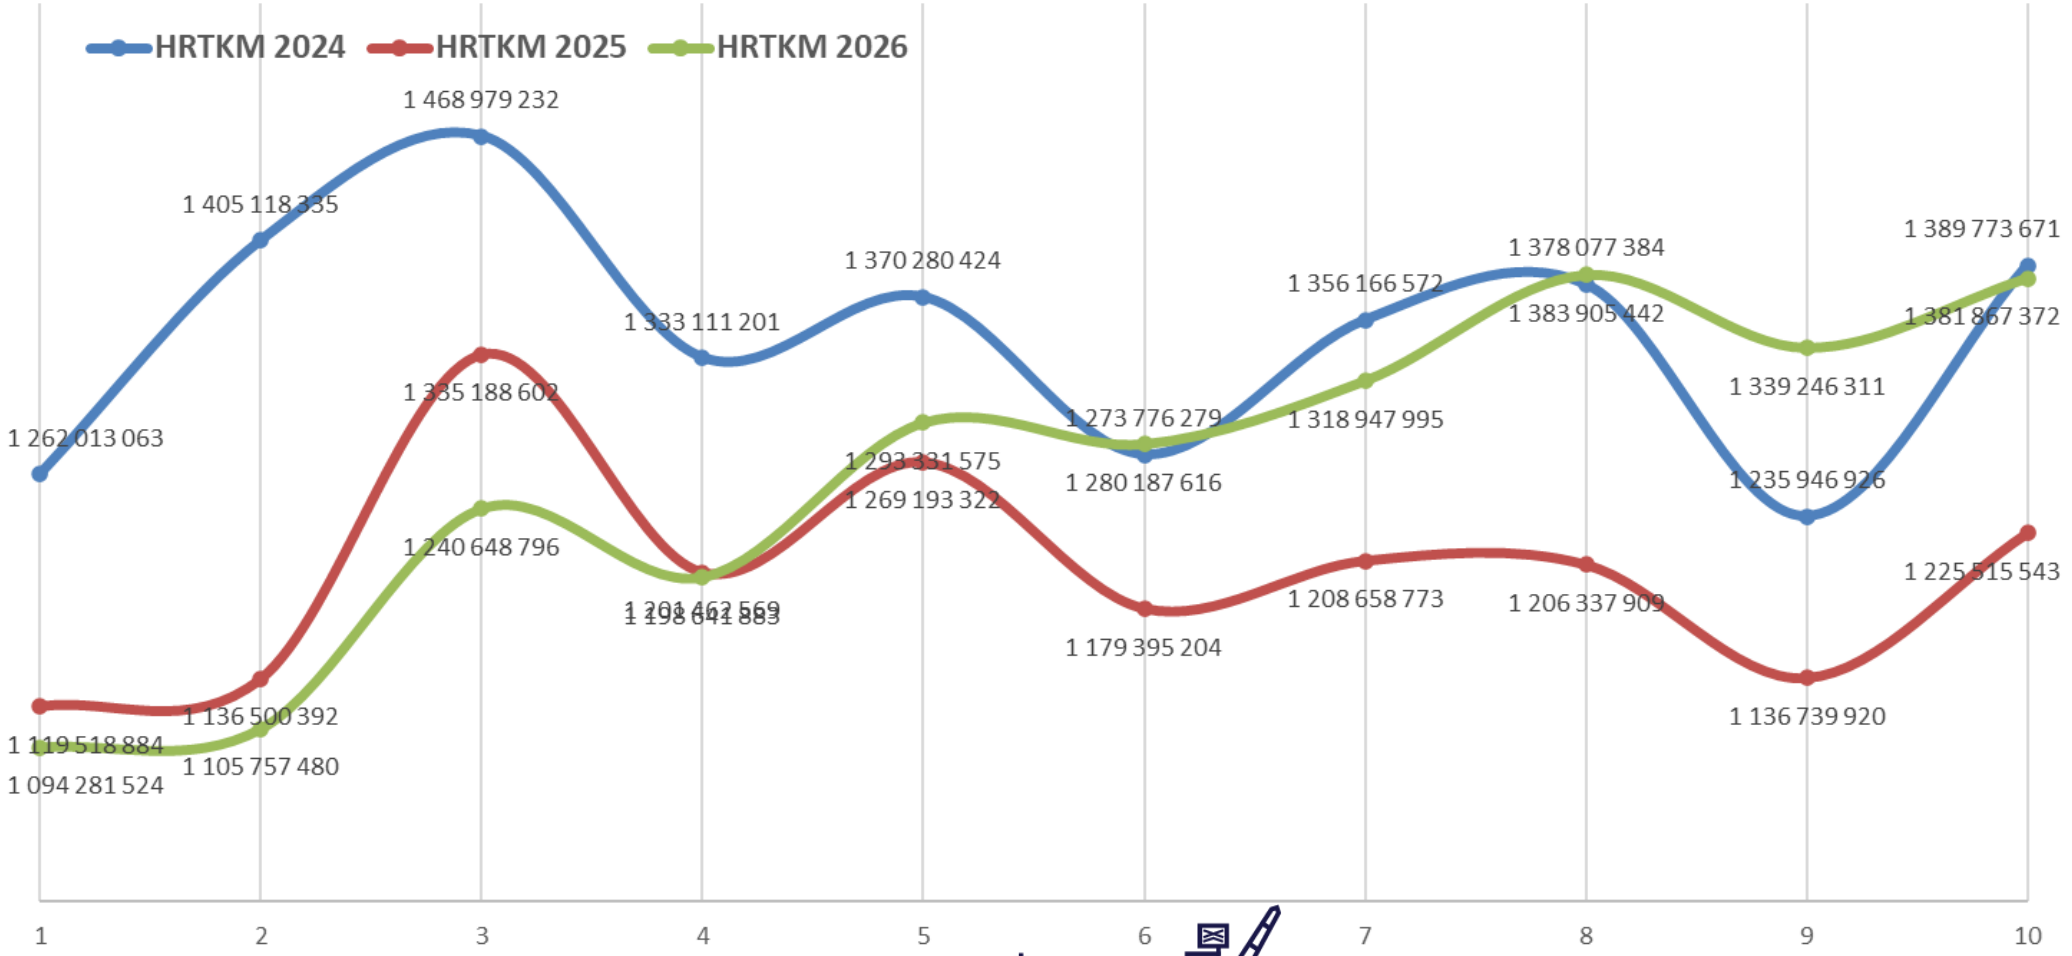

Intenzity ND cez PPS


Denný priemer vlakov ND
za 1.- 39.týždeň (do 28.09.) 2026

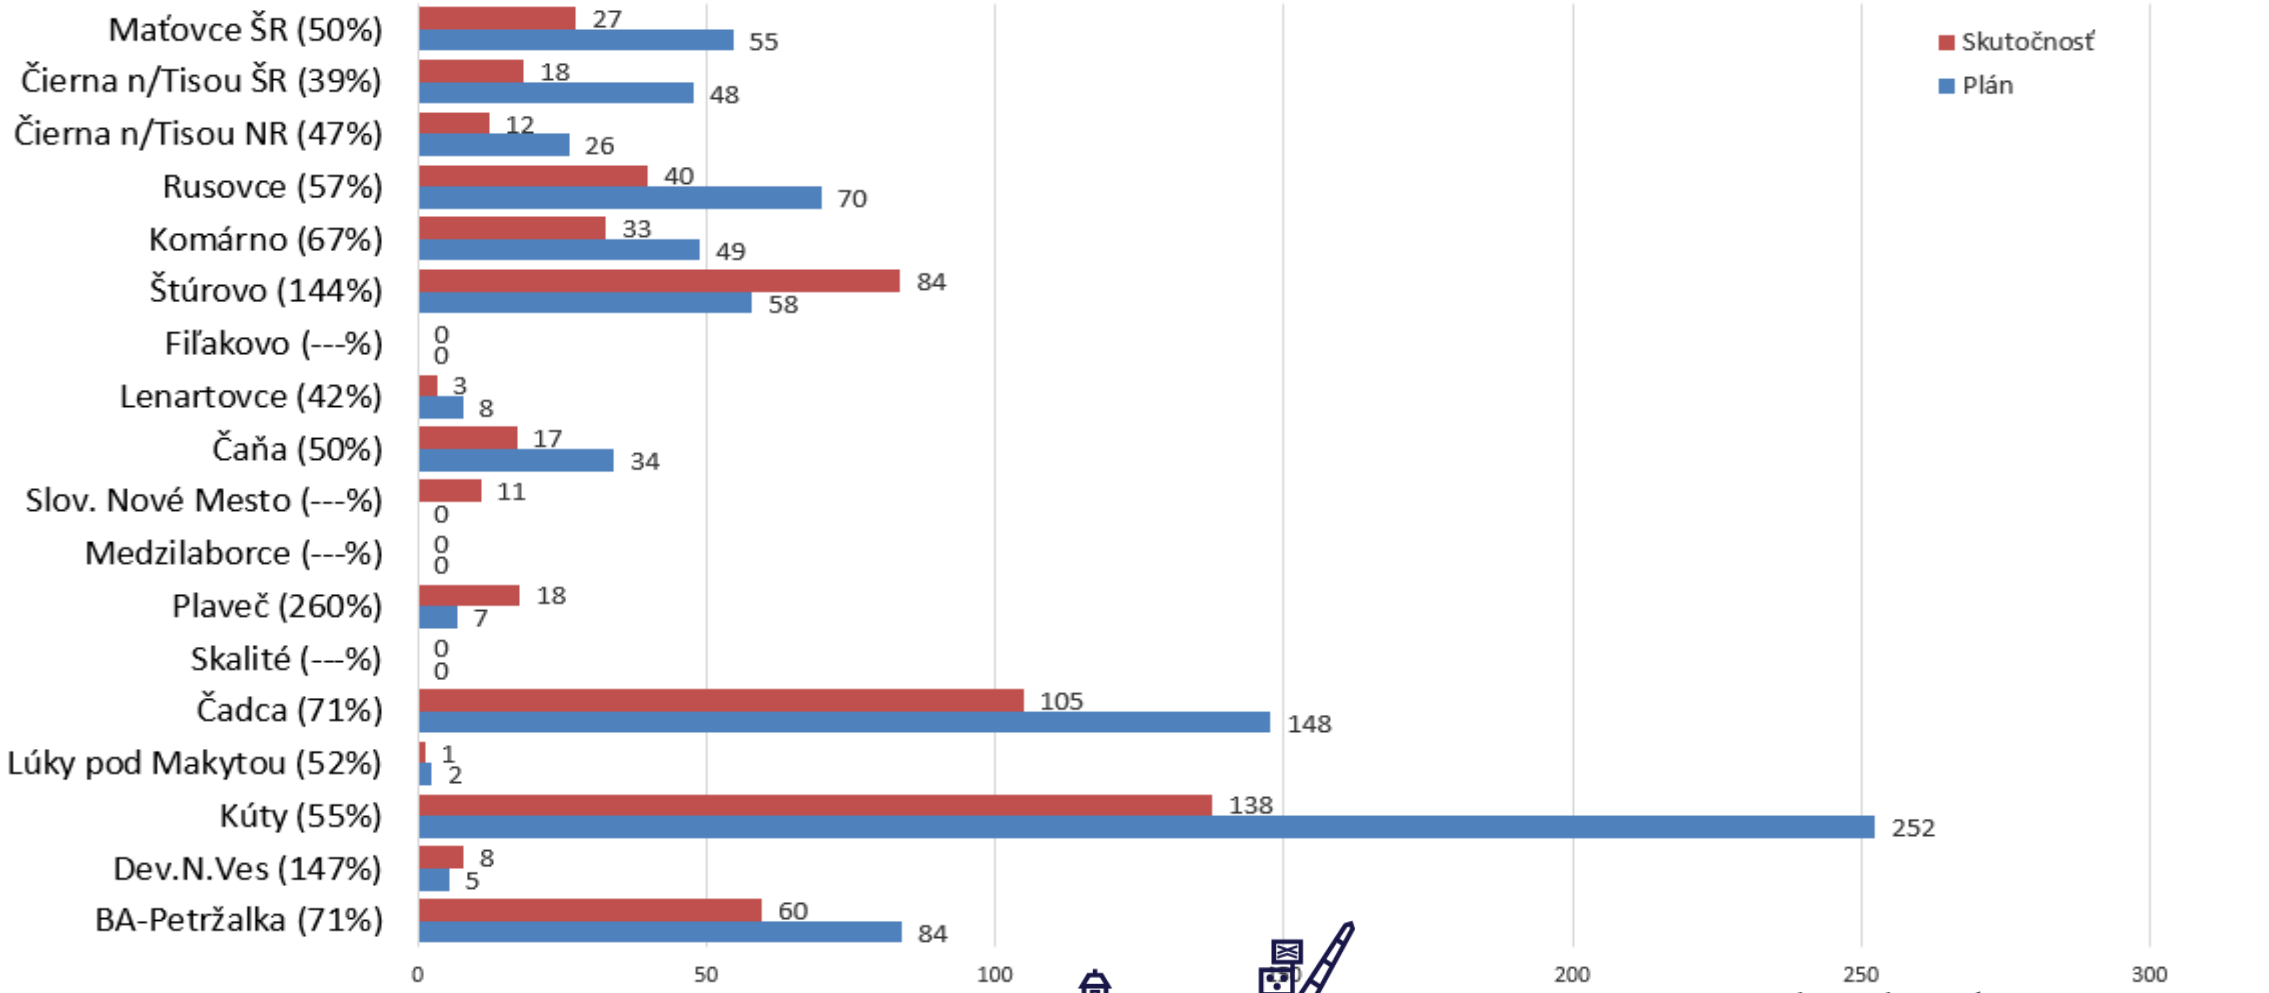

Nehody, prevádzkové poruchy a ostatné udalosti zavinené/spoluzavinené dopravcami

Kategória NU	2021	2022	2023	2024	2025	1H 2026
A (vážne nehody)	1	1	0	0	4	0
B (menšie nehody)	23	21	21	18	5	5
C (incident)	33	24	31	33	25	17
D (prev. poruchy)	66	69	66	47	45	16
OU (ostatná udalosť)	18	16	16	7	23	6
	141	**131**	**134**	**105**	**102**	**44**

C4 - Prejdenie návesti zakazujúcej jazdu (1H/2026)

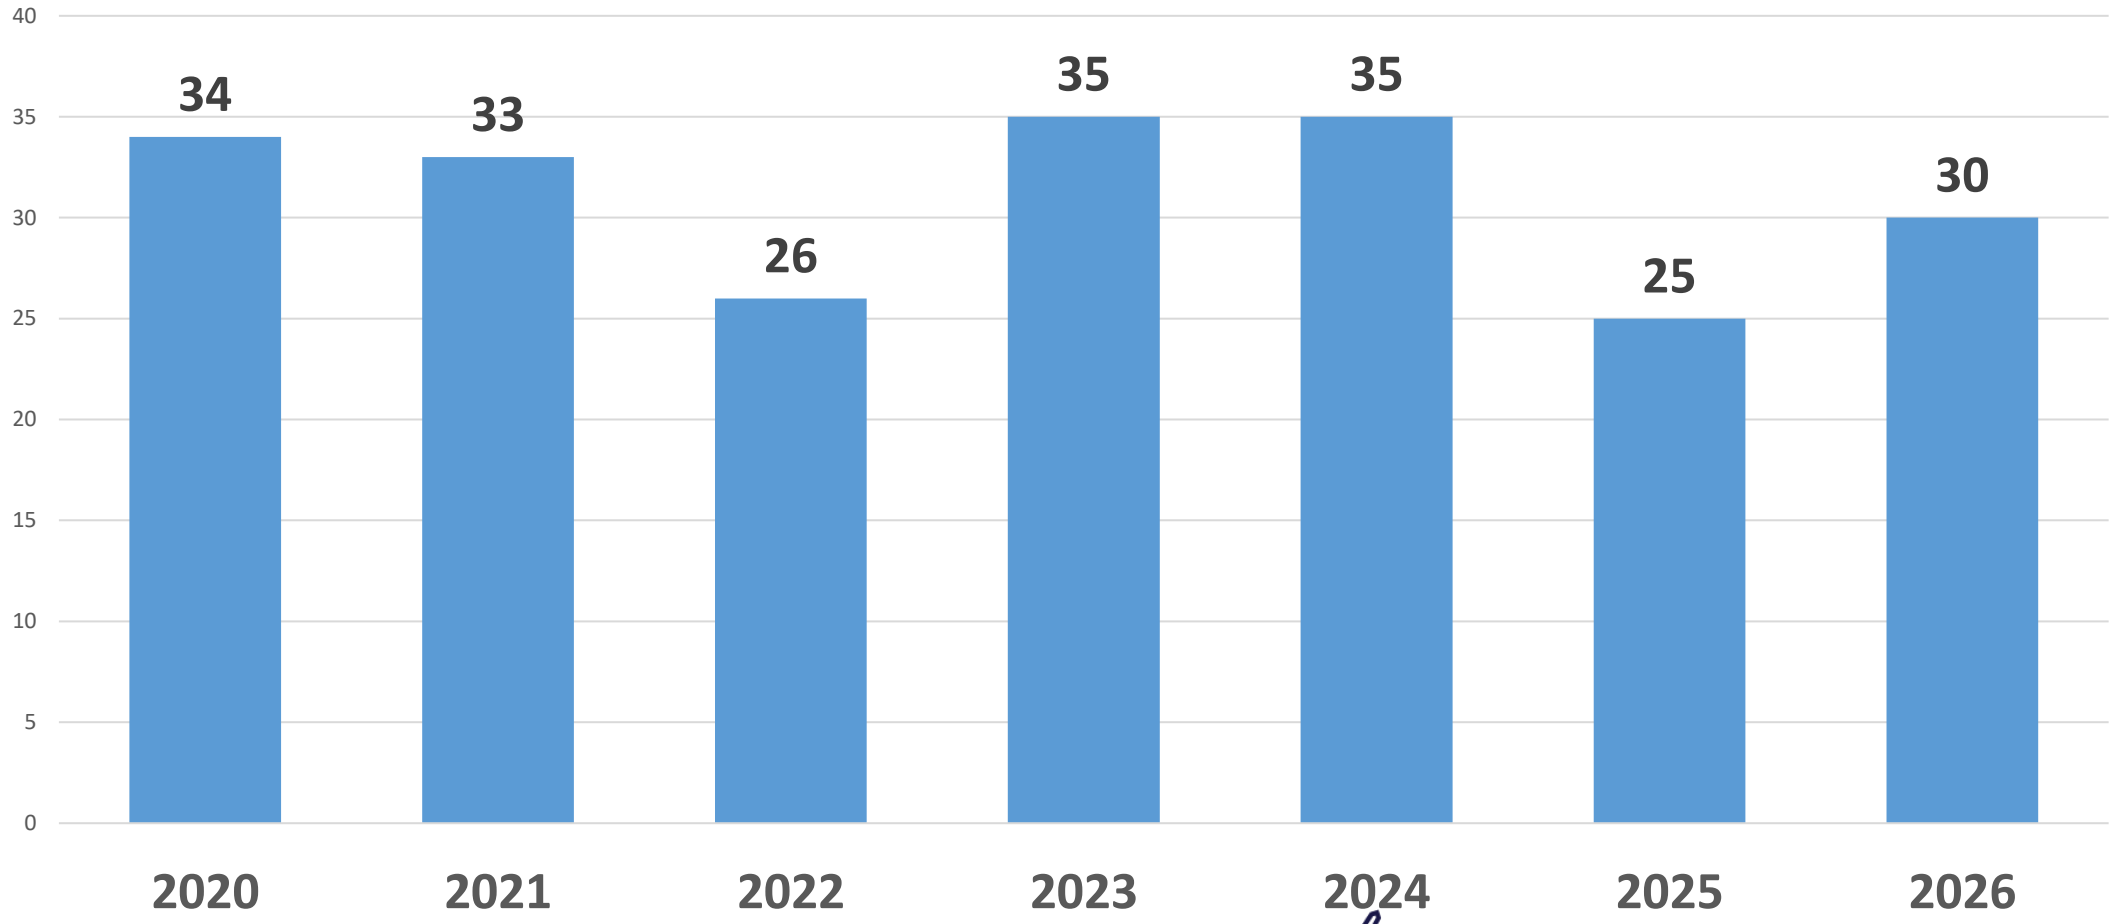

Obmedzenie kapacity železničnej infraštruktúry

POTR – všetky dôvody zavedenia						
Koľaje	stav k 20.09.2025		stav k 20.09.2026		Rozdiel 2025 – 2026 +nárast/-pokles	
	počet	dĺžka v m	počet	dĺžka v m	počet	dĺžka v m
všetky	124	106 399	146	124 306	**22**	**17 907**
hlavné	69	76 826	98	97 248	**29**	**20 422**

POTR – zavedené z dôvodu chýb na železničnej infraštruktúre						
Koľaje	stav k 20.09.2025		stav k 20.09.2026		Rozdiel 2025 – 2026 +nárast/-pokles	
	počet	dĺžka v m	počet	dĺžka v m	počet	dĺžka v m
všetky	90	49 743	92	42 534	**2**	**- 7 209**
hlavné	37	20 390	44	15 476	**7**	**- 4 914**


Obmedzenie kapacity železničnej infraštruktúry

www.zsr.sk


/sluzby-verejnosti


/pre-cestujucich

/plan-vyluk

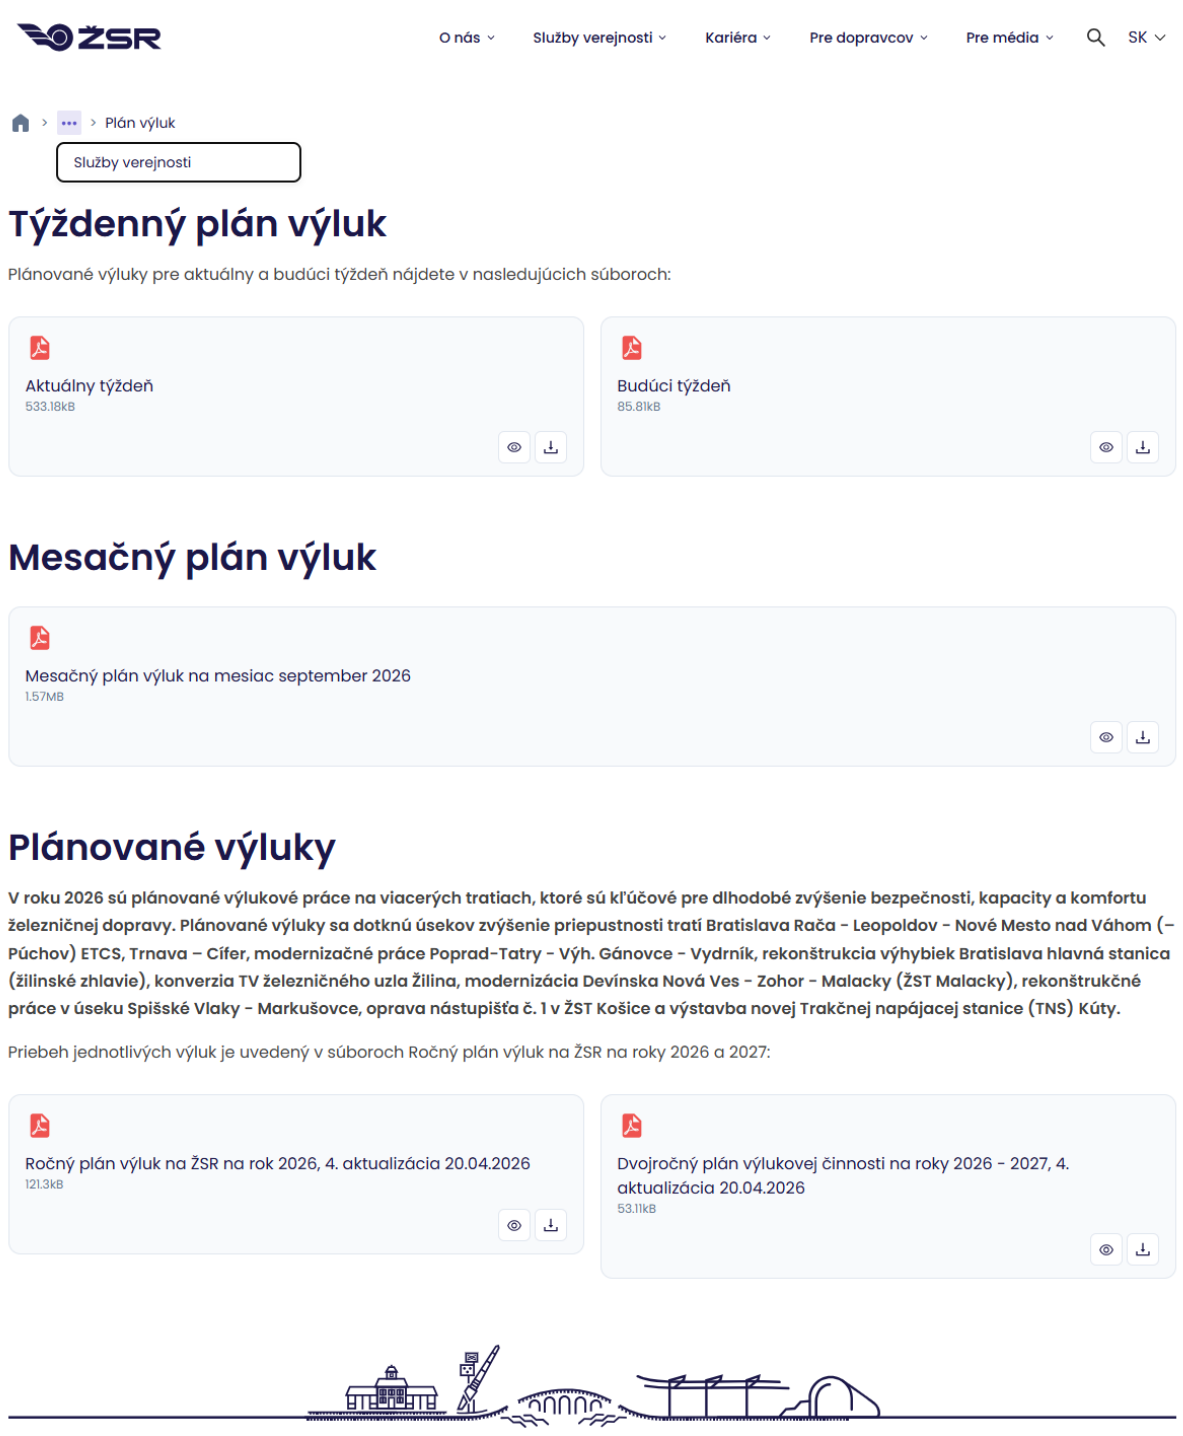

Obmedzenie kapacity železničnej infraštruktúry (2026)

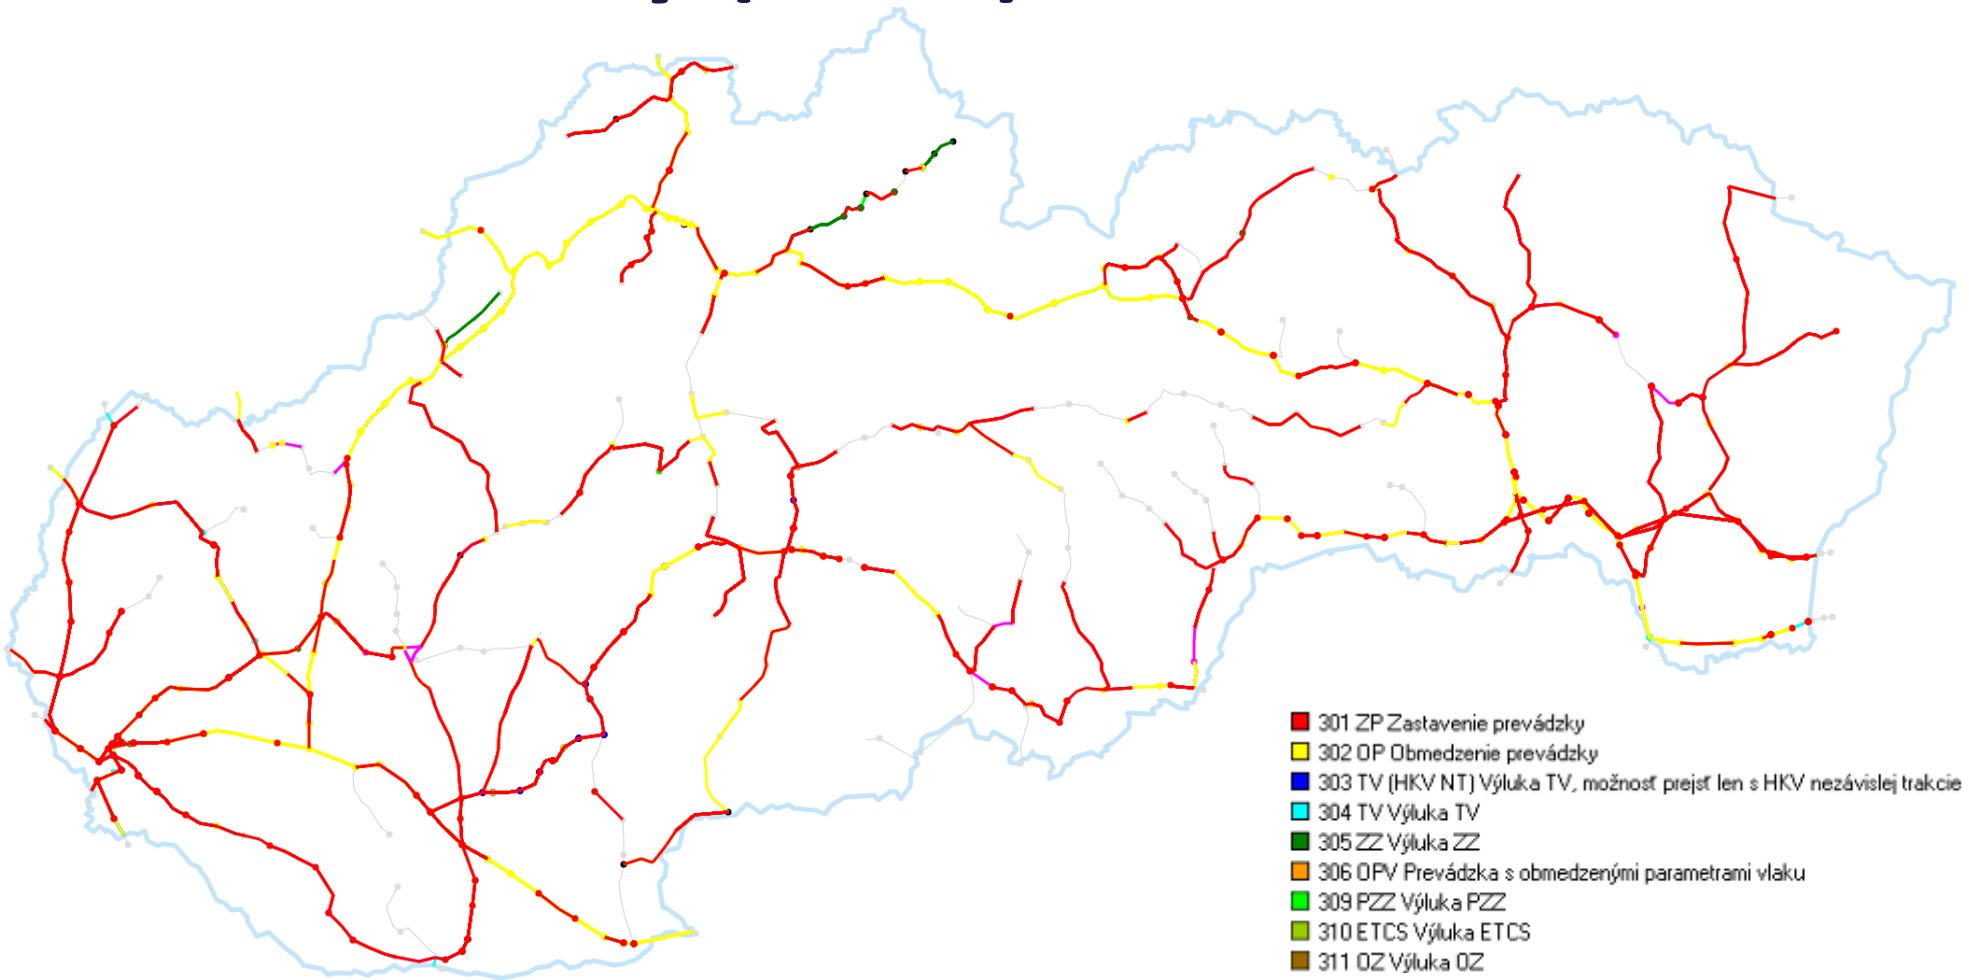

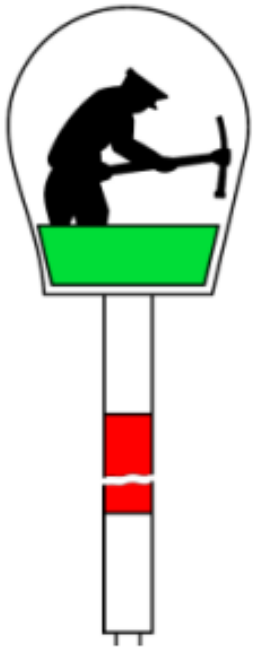


Obmedzenie kapacity železničnej infraštruktúry (2027)

P.Č.	O220 O450 OR MO	Traťový úsek ŽST	Účel, upresnenie	Výluky		január				február				marec				apríl				máj				jún				júl				august				september				október				november				december				NAD
				Počet	Termín	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	
OR Košice																																																							
Výlukové rameno: Čierna nad Tisou – Michaľany																																																					
1	OR	ŽST Čierna nad Tisou kol. č. 2 medzi výh. č. 81 – 84 + TV	Komplexná rekonštrukcia koľaje (0,100 km)	5 D	18. 10. – 22. 10. 2027																																																		
2	OR	ŽST Čierna nad Tisou ŠR kol. č. 602š	Oprava koľajového lôžka koľaje a výmena koľajníc (1,000 km)	42 D	10. 05. – 20. 06. 2027																	19																																				
3	OR	ŽST Pribeník výh. č. 933, 934, 935	Oprava koľajového lôžka výhybiek (0,200 km)	11 D	20. 09. – 30. 09. 2027																																					38	39																
4	OR	ŽST Pribeník kol. č. 1, kol. spojka výh. č. 24 – 21 + TV	Oprava koľajového lôžka koľaje (0,100 km)	8 D	04. 10. – 11. 10. 2027																																							41	42														
5	O450	ŽST Slovenské Nové Mesto – zast. Čerhov TK 1 + TV	Oprava koľajového lôžka koľaje a súvislá výmena koľajníc JR 2027 km 37,926 – 43,400 (10,948 km)	50 N	06. 07. – 24. 08. 2027																											26	27	28	29	30	31	32	33	34																		
Výlukové rameno: Michaľany – Košice																																																						
1	OR	ŽST Michaľany kol. č. 1 + TV	Oprava koľajového lôžka koľaje km 50,760 – 51,160 (0,400 km)	6 N	08. 11. – 13. 11. 2027																																																	45	46				
2	OR	ŽST Michaľany kol. č. 4 + TV	Oprava koľajového lôžka koľaje km 50,650 – 51,550 (0,900 km)	13 N	09. 08. – 21. 08. 2027																																	29	30	31																		
3	OR	ŽST Michaľany výh. č. 37, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 46, stred DKS + TV ŽST Kuzmice – ŽST Michaľany TK 1/2 + TV	Oprava koľajového lôžka výhybiek km 51,595 – 51,675 (0,080 km)	28 N	30. 08. – 26. 09. 2027																																			35	36	37	38	39														
4	OR	ŽST Krásna nad Hornádom kol. č. 9	Oprava koľajového lôžka koľaje km 91,600 – 92,300 (0,700 km)	12 N	27. 09. – 08. 10. 2027																																							40	41														
5	OR	ŽST Krásna nad Hornádom – ŽST Barca, St. 4 (Krásnohornádska spojka) + TV	Súvislá výmena podvalov (2 630 ks, 1,677 km)	12 N	17. 05. – 28. 05. 2027																	17	18																																						
6	OR	ŽST Košice nákladná stanica kol. č. 116, 152, 154 + TV	Oprava koľajového lôžka koľají (0,200 km)	16 D	06. 07. – 10. 07. 2027 12. 07. – 22. 07. 2027																											26	27	28	29	30																								
Výlukové rameno: Košice – Spišská Nová Ves																																																					
1	OR	ŽST Košice kol. č. 2 + TV	Oprava koľajového lôžka koľaje km 98,100 – 98,650 (0,550 km)	7 N	17. 08. – 23. 08. 2027																																	33	34																			
2	OR	ŽST Košice kol. č. 4 + TV	Oprava koľajového lôžka koľaje km 98,100 – 98,670 (0,570 km)	7 N	24. 06. – 30. 06. 2027																																																					
3	OR	ŽST Kysak kol. č. 2 + TV	Oprava koľajového lôžka koľaje km 114,000 – 114,600 (0,600 km) Oprava nástupišťa	7 N	11. 10. – 17. 10. 2027																																																					
4	MO	ŽST Kysak – ŽST Malá Lodina TK 1 + TV	Súvislá výmena mostníc MO km 117,284 a MO km 117,974	12 N	10/2027																																																				
5	MO	ŽST Malá Lodina – ŽST Kysak TK 2 + TV	Súvislá výmena mostníc MO km 117,290 a MO km 117,974	12 N	11/2027																																																			
6	O450	ŽST Markušovce – ŽST Spišské Vlachy TK 1 + TV	Komplexná rekonštrukcia koľaje JR 2027 Oprava koľajového lôžka koľaje Súvislá výmena koľajníc km 151,705 – 163,822 (12,117 km)	51 N	20. 05 – 09. 07. 2027																	20																																				
7	O450	ŽST Spišské Vlachy – ŽST Markušovce, TK 2 + TV	Súvislá výmena koľajníc s výmenou upevňovadiel JR 2027 Zriaďovanie BK km 151,705 – 163,822 (12,117 km)	28 N	22. 04. – 19. 05. 2027															22					19																																		
Výlukové rameno: Spišská Nová Ves – Štrba																																																					
1	O220	ŽST Spišská Nová Ves – ŽST Vydrník TK 2 + TV	Modernizácia – výh. Letanovce	18 N	14. 03. – 31. 03. 2027										14																																									
2	O220	ŽST Vydrník – ŽST Spišská Nová Ves TK 1 + TV	Modernizácia – výh. Letanovce	21 N	01. 04. – 21. 04. 2027														12			21																																			
3	O220	ŽST Vydrník kol. č. 1, 3a, 3b, 5 + TV	Modernizácia	15 N	01. 03. – 15. 03. 2027									13	14																																									

Hárok Microsoft Excelu 97-2003

Obmedzenie kapacity železničnej infraštruktúry (2027)

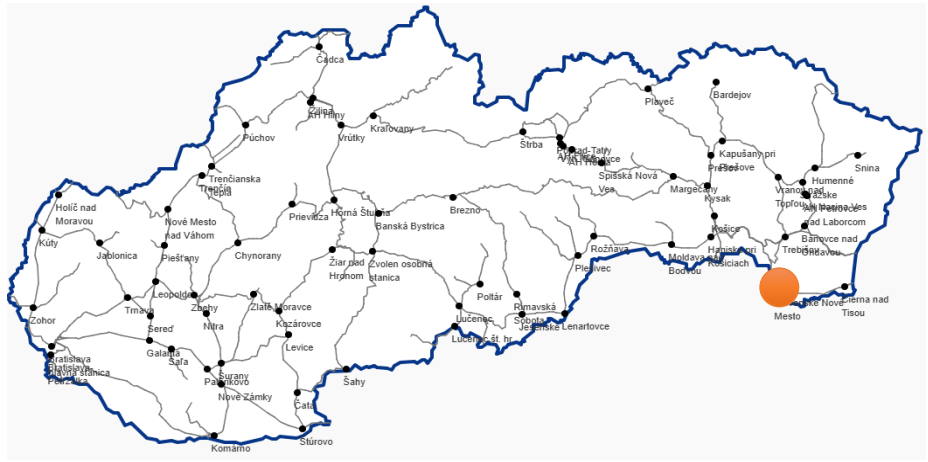


Výlukové rameno: Čierna nad Tisou – Michaľany					
5	O450	ŽST Slovenské Nové Mesto – zast. Čerhov TK 1 + TV	Oprava kolajového lôžka koľaje a súvislá výmena koľajníc JR 2027 km 37,926 – 43,400 (10,948 km)	50 N	06. 07. – 24. 08. 2027
Výlukové rameno: Michaľany – Košice					
3	OR	ŽST Michaľany výh. č. 37, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 46, stred DKS + TV ŽST Kuzmice – ŽST Michaľany TK 1/2 + TV	Oprava kolajového lôžka výhybiek km 51,595 – 51,675 (0,080 km)	28 N	30. 08. – 26. 09. 2027

Obmedzenie kapacity železničnej infraštruktúry (2027)




Výlukové rameno: Košice – Spišská Nová Ves					
6	O450	ŽST Markušovce – ŽST Spišské Vlachy TK 1 + TV	Komplexná rekonštrukcia koľaje JR 2027 Oprava koľajového lôžka koľaje Súvislá výmena koľajníc km 151,705 – 163,822 (12,117 km)	51 N	20. 05 – 09. 07. 2027
7	O450	ŽST Spišské Vlachy – ŽST Markušovce, TK 2 + TV	Súvislá výmena koľajníc s výmenou upevňovadiel JR 2027 Zriaďovanie BK km 151,705 – 163,822 (12,117 km)	28 N	22. 04. – 19. 05. 2027

Obmedzenie kapacity železničnej infraštruktúry (2027)

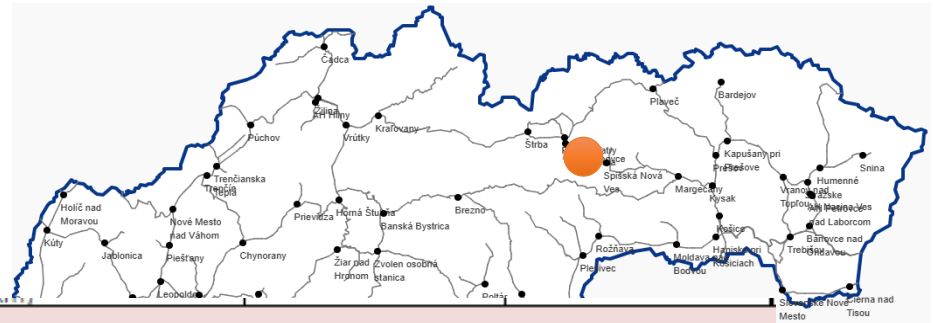

Čadca
Bardejov
Prievidza
Púchov
Vrútky
Kráľovany
Strba
Spišská Nová Ves
Margecany
Kysak
Humenné
Snina
Trenčianska Turná
Holíč nad Moravou
Nové Mesto nad Váhom
Prievidza
Horná Štubňa
Banská Bystrica
Brezno
Kúty
Jablonica
Pieštany
Chynorany
Žiar nad Hronom
Zvolen osobná stanica
Rožňava
Moldava nad Bodvou
Košice
Hanisk
Košiciach
Bánovce nad Bebravou
Trebišov
Leopoldov
Poltár
Sobrance
Michalovce
Vranov nad Topľou
Medzilaborce
Stropkov
Svidník
Humenné
Sabinov
Lipany
Kapušany pri Prešove
Prešov
Plaveč
Stará Ľubovňa
Nová Ľubovňa
Stará Lesná
Vysoké Tatry
Poprad-Tatry
Kežmarok
Spišská Nová Ves
Levoča

Obmedzenie kapacity železničnej infraštruktúry (2027)

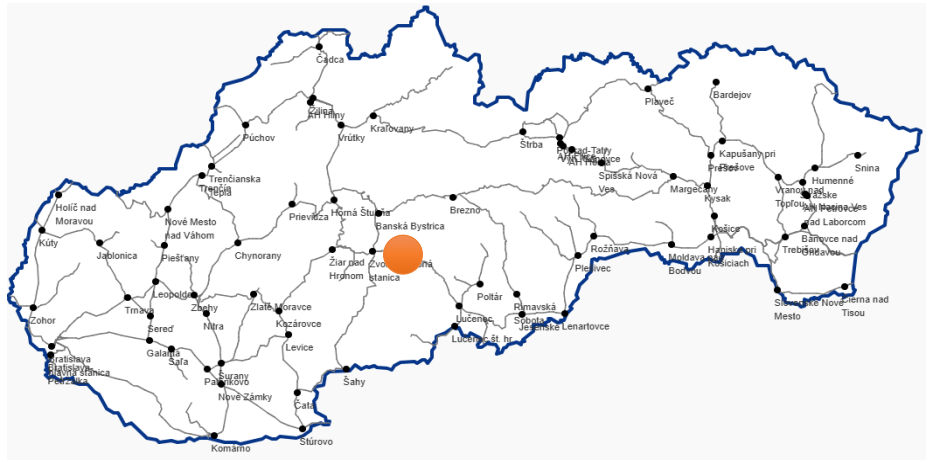


Výlukové rameno: Fiľakovo – Zvolen					
3	OR	ŽST Vígľaš – Výh. Slatinka TK	Oprava železničného priepustu km 203,960	30 N	01. 09. – 30. 09. 2027

Obmedzenie kapacity železničnej infraštruktúry (2027)

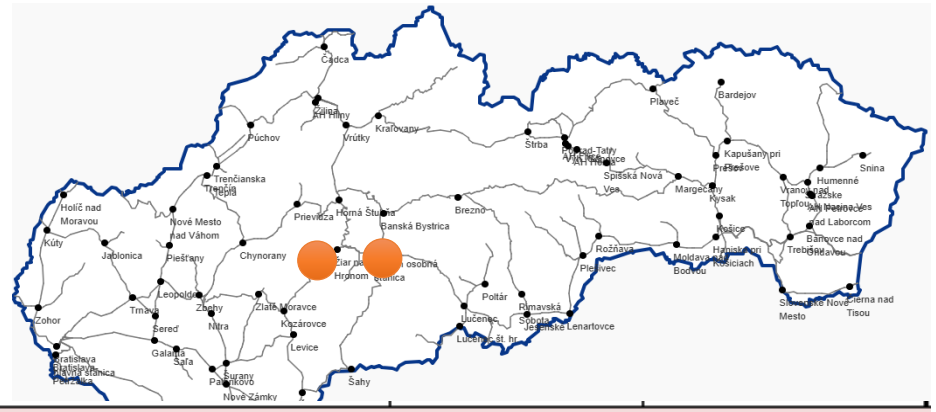


Výlukové rameno: Zvolen – Levice					
1	O450	ŽST Zvolen osobná stanica nsk ŽST Hronská Dúbrava – ŽST Zvolen osobná stanica TK 1	Komplexná rekonštrukcia výh. č. 68, 70, 71, 73	29 N	Etapizácia podľa TP 07, 08/2027
		ŽST Zvolen osobná stanica psk ŽST Zvolen osobná stanica – ŽST Hronská Dúbrava TK 2	Komplexná rekonštrukcia výh. č. 66, 67, 75, 76	29 N	
		ŽST Zvolen osobná stanica psk	Komplexná rekonštrukcia výh. č. 65	4 N	
4	OR	ŽST Žarnovica kol'. č. 1	Oprava nástupíšť (oprava povrchov, oprava nástupištných hrán)	30 N	01. 04. – 30. 04. 2027
5	OR	ŽST Žarnovica kol'. č. 2	Oprava nástupíšť (oprava povrchov, oprava nástupištných hrán)	31 N	01. 05. – 31. 05. 2027
6	OR	ŽST Žarnovica kol'. č. 4	Oprava nástupíšť (oprava povrchov, oprava nástupištných hrán)	30 N	01. 06. – 30. 06. 2027

Obmedzenie kapacity železničnej infraštruktúry (2027)

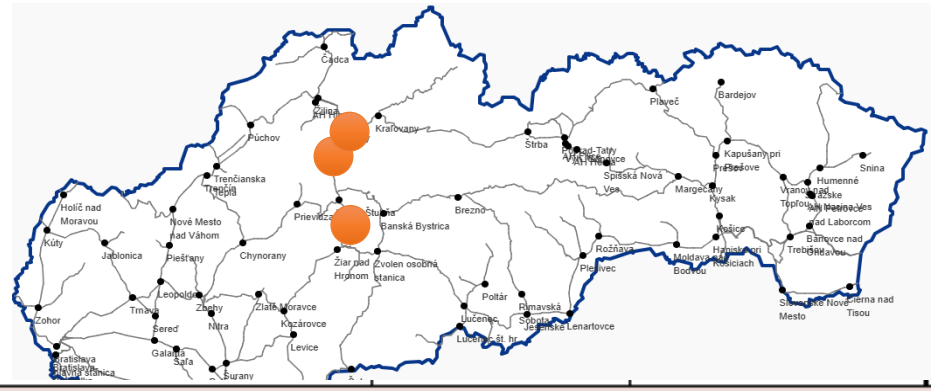

Výlukové rameno: Martin – Vrútky					
1	O450	ŽST Martin – ŽST Vrútky TK 2 ŽST Vrútky výh. č. 122, 123, 124	Komplexná rekonštrukcia koľaje koľ. č. 1, 2 JR 2027 s úplnou výmenou koľajového roštu km 306,241 – 310,816 Komplexná rekonštrukcia výhybiek	60 N	03. 05. – 01. 07. 2027
Výlukové rameno: Odb. Dolná Štubňa – Martin					
1	OR	ŽST Príbovce-Rakovo – ŽST Martin TK 1	Súvislá výmena koľajníc S 49 (2 x 3 000 m) a podvalov SB8 (5 000 ks) Odvoz užitého materiálu (koľajnice, podvaly)	55 D	03 – 06/2027
Výlukové rameno: Hronská Dúbrava – Horná Štubňa					
2	OR	ŽST Kremnica – ŽST Kremnické Bane (tunel Sohler) TK	Znižovanie nivelety tunel Sohler km 255,608–256,767 KRŽZ JR 2027	62 N	01. 07. – 31. 08. 2027


Obmedzenie kapacity železničnej infraštruktúry (2027)

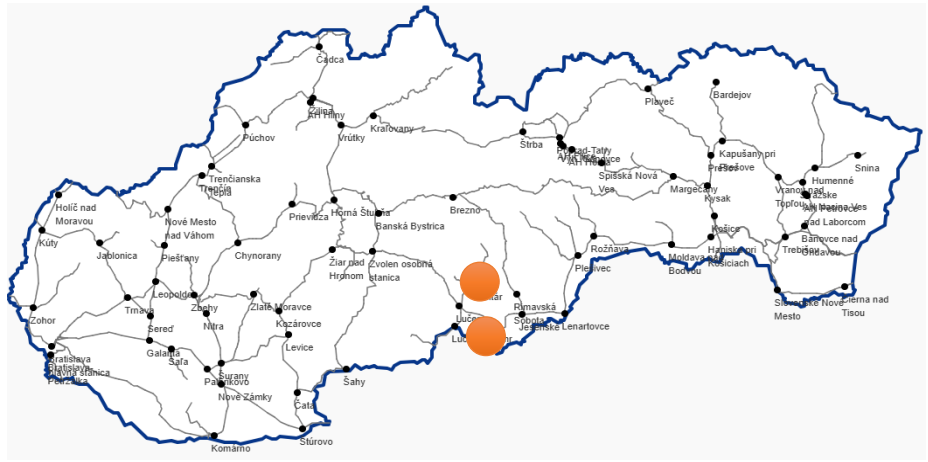

Výlukové rameno: Utekáč – Lučenec					
2	OR	ŽST Kokava nad Rimavicou – ŽST Zlatno – ŽST Poltár TK	Výmena koľajových polí (3 000 m)	56 N	04 – 06/2027

Výlukové rameno: štátna hranica HU/SK – Fiľakovo					
1	OR	štátna hranica HU/SK – Fiľakovo TK	Súvislá výmena 5 500 ks podvalov, rekonštrukcia priepustu v km 136,308	84 D	04 – 06/2027

Obmedzenie kapacity železničnej infraštruktúry (2027)

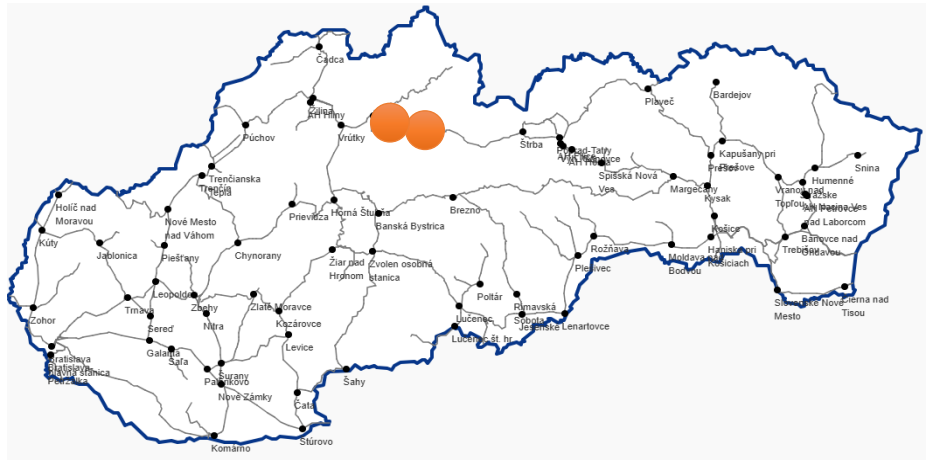


Výlukové rameno: Ružomberok – Žilina					
1	O450	ŽST Ružomberok nsk/psk, výh. č. 36, 37, 38, 39, 40, 41, stred DKS ŽST Ružomberok – ŽST Ľubochňa TK 1/2 + TV	Komplexná rekonštrukcia výhybiek JR 2027	47 N	16. 08. – 01. 10. 2027
2	O450	ŽST Ľubochňa nsk/psk, výh. č. 13, 14, 15, 16 ŽST Ľubochňa – ŽST Kraľovany TK 1/2 + TV	Komplexná rekonštrukcia DKS výhybiek JR 2027	50 N	04. 10. – 22. 11. 2027

Obmedzenie kapacity železničnej infraštruktúry (2027)




Výlukové rameno: Trenčín – Chynorany					
1	MO	ŽST Trenčianske Jastrabie – zast. Svinná TK	Obnova hydroizolácie MO km 28,186	5 N	10/2027
2	OR	ŽST Trenčianske Jastrabie – zast. Svinná TK	Výmena koľajového roštu materiálom užitým km 28,500 – 30,100	30 N	01. 10. – 30. 10. 2027
3	MO	zast. Svinná – ŽST Ruskovce TK	Obnova hydroizolácie MO km 25,141	5 N	10/2027

Obmedzenie kapacity železničnej infraštruktúry (2027)

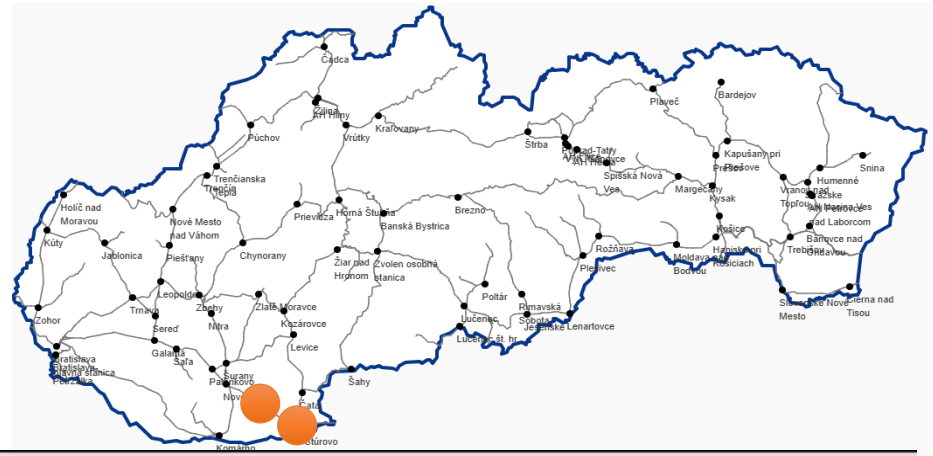


Výlukové rameno : štátna hranica HU– Štúrovo – Nové Zámky					
1	OR	ŽST Štúrovo koľ. č. 18, 26 + TV	Oprava koľajového lôžka koľaje	30 N	01. 09. – 30. 09. 2027
2	O450	ŽST Mužla – ŽST Gbelce TK 1/2 + TV ŽST Gbelce nsk/psk, výh. č. 1 – 6	Obnova koľaje a výhybiek JR 2027	60 N	19. 04. – 17. 06. 2027
3	OR	ŽST Gbelce koľ. č. 4	Komplexná rekonštrukcia koľaje	15 N	počas stavby JR
4	O450	ŽST Gbelce nsk/psk, výh. č. 13, 14, 17 – 20 ŽST Gbelce – ŽST Strekov TK 1/2 + TV	Obnova koľaje a výhybiek JR 2027	60 N	18. 06. – 16. 08. 2027
5	OR	ŽST Strekov koľ. č. 3 + TV	Komplexná rekonštrukcia koľaje	16 N	01. 04. – 16. 04. 2027
6	O450	ŽST Dvory nad Žitavou nsk/psk výh. č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ŽST Dvory nad Žitavou – ŽST Pribeta TK 1/2 + TV	Komplexná rekonštrukcia výhybiek JR 2027	40 N	20. 09. – 29. 10. 2027

Obmedzenie kapacity železničnej infraštruktúry (2027)

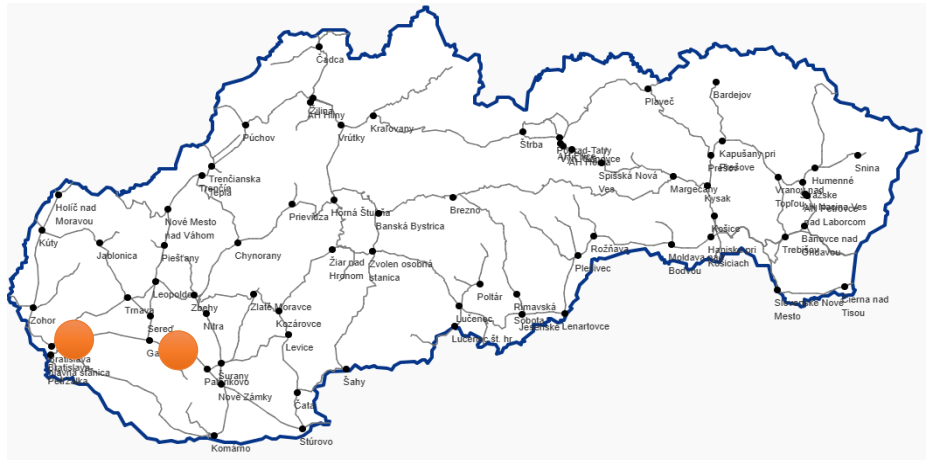


Výlukové rameno : Nové Zámky – Bratislava hlavná stanica					
1	O450	ŽST Galanta – ŽST Šaľa TK 1/2 + TV	Oprava koľajového lôžka koľaje JR 2027 Súvislá výmena koľajníc	180 N	31. 05. – 26. 11. 2027
2	O450	ŽST Galanta nsk/psk, výh. č. 1, 2, 3, 4, stred DKS, 5, 6, 7a/b ŽST Galanta – ŽST Šaľa TK 1/2 + TV	Komplexná rekonštrukcia výhybiek JR 2027	2 x 30 N	počas stavby JR
3	O450	ŽST Bratislava Vajnory nsk/psk, výh. č. 22, 23, 29 ŽST Bratislava Vajnory – ŽST Bratislava východ OSJ koľ. č. 4d + TV	Komplexná rekonštrukcia koľ. č. 1, 2 JR 2027 a komplexná rekonštrukcia výhybiek	25 N	12. 04. – 06. 05. 2027
4	O450	ŽST Bratislava Vajnory psk, výh. č. 25, 26, 27, 28 ŽST Bratislava Vajnory – Odb Močiar TK 2 + TV	Komplexná rekonštrukcia koľ. č. 1, 2 JR 2027 a komplexná rekonštrukcia výhybiek	25 N	15. 03. – 08. 04. 2027

Obmedzenie kapacity železničnej infraštruktúry (2027)

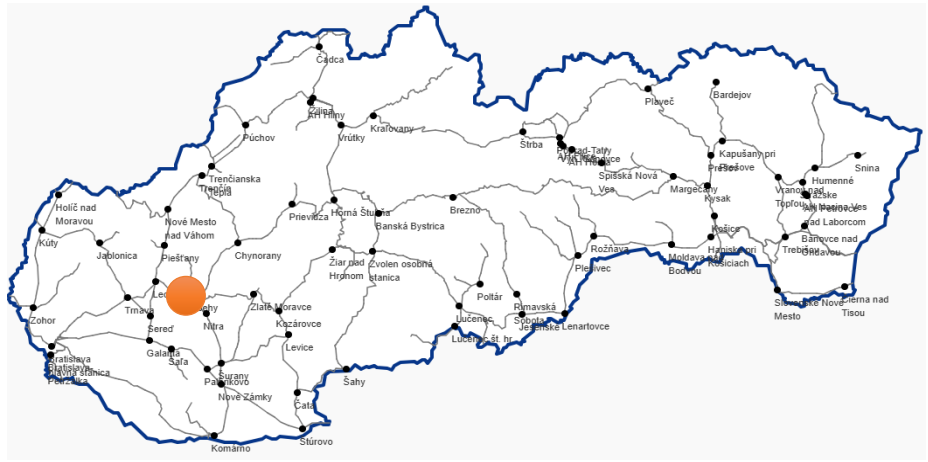


Výlukové rameno : Zbehy – Leopoldov					
1	OR	ŽST Zbehy koľ. č. 4	Komplexná rekonštrukcia koľaje	30 N	01. 09. – 30. 09. 2027
2	O450	ŽST Zbehy – ŽST Alekšince TK	Komplexná rekonštrukcia koľaje JR 2027	62 N	01. 07. – 31. 08. 2027

Obmedzenie kapacity železničnej infraštruktúry (2027)

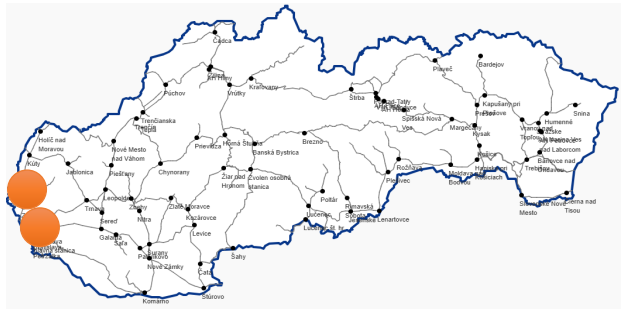

Výlukové rameno : Bratislava hlavná stanica – Kúty					
1	O450	ŽST Bratislava hlavná stanica koľ. 1d, 1f, 2c, 2f, 6b, 8b, 10b + TV výh. č. 51, 52, 53, 54, 55, 56ab, 57, 58 + DKS	Komplexná rekonštrukcia výhybiek JR 2027	80 N	06. 09. – 24. 11. 2027
2	OR	ŽST Bratislava Lamač – ŽST Devínska Nová Ves TK 2	Súvislá výmena podvalov Oprava geometrickej polohy koľaje	10 D	podľa termínov modernizácie
3	OR	ŽST Devínska Nová Ves – ŽST Bratislava Lamač TK 1	Oprava geometrikcej polohy koľaje	3 D	podľa termínov modernizácie
4	O220	ŽST Zohor koľ. č. 16, 18 (nové koľ. č. 12, 14)	Modernizácia	131 N	11. 12. – 31. 12. 2026) 01. 01. – 20. 04. 2027
5	O220	ŽST Zohor čiast. psk, výh. č. 2 + TV ŽST Rohožník – ŽST Zohor TK	Modernizácia	15 N	13. 07. – 28. 07. 2027
6	O220	ŽST Zohor čiast. psk + TV ŽST Rohožník – ŽST Zohor TK	Modernizácia	26 N	29. 07. – 25. 08. 2027
7	O220	ŽST Zohor čiast. nsk + TV ŽST Zohor – Výh. Malý Háj TK 1 + TV	Modernizácia	102 N	08. 01. – 20. 04. 2027
8	O220	ŽST Zohor čiast. psk + TV Výh. Malý Háj – ŽST Zohor TK 2 + TV	Modernizácia	82 N	21. 04. – 12. 07. 2027
13	O220	ŽST Malacky – ŽST Zohor TK 1 + TV	Modernizácia	150 N	(03. 11. – 31. 12. 2026)
9	O220	ŽST Zohor – ŽST Malacky TK 2 + TV	Modernizácia	134 N	05. 04. – 17. 08. 2027
10	O220	ŽST Malacky – ŽST Zohor TK 1 + TV ŽST Malacky nsk + TV	Modernizácia	162 N	08. 03. – 17. 08. 2027
11	O220	ŽST Malacky – ŽST Zohor TK 1 + TV ŽST Malacky nsk + TV	Modernizácia	175 N	18. 08. – 31. 12. 2027 (01. 01. – 09. 02.
12	O220	ŽST Malacky psk + TV	Modernizácia	166 N	(01. 10. – 31. 12. 2026)
14	O220	ŽST Malacky – ŽST Veľké Leváre TK 2 + TV	Modernizácia	131 N	(05. 11. – 31. 12. 2026)
15	OR	ŽST Sekule – ŽST Veľké Leváre TK 1	Súvislá výmena podvalov, následok po NU	30 D	podľa termínov modernizácie

Obmedzenie kapacity železničnej infraštruktúry (2027)

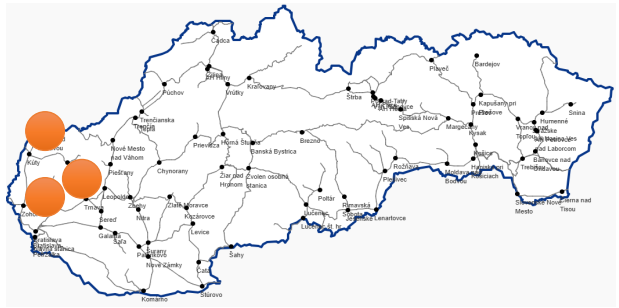

Výlukové rameno: Plavecký Mikuláš – Záhorská Bystrica					
1	O220	ŽST Rohožník – ŽST Zohor TK	Modernizácia	15 N + 26 N	13. 07. – 25. 08. 2027
Výlukové rameno: Kúty – Holíč nad Moravou – štátna hranica SK/CZ (Hodonín)					
1	OR	ŽST Holíč – ŽST Hodonín TK	Komplexná rekonštrukcia železničného zvršku	15 N	22. 02. – 08. 03. 2027
Výlukové rameno: Trnava – Kúty					
1	OR	ŽST Šelpice koľ. č. 1, 2	Komplexná rekonštrukcia železničného zvršku	22 N	27. 04. – 18. 05. 2027
2	OR	ŽST Šelpice koľ. č. 1, 2, 4, 101	Komplexná rekonštrukcia priecestia km 9,852	9 N	10. 05. – 18. 05. 2027
3	OR	ŽST Boleráz koľ. č. 3	Komplexná rekonštrukcia železničného zvršku	19 N	21. 09. – 09. 10. 2027
4	OR	Výh. Dúbrava koľ. č. 3	Komplexná rekonštrukcia železničného zvršku	18 N	08. 04. – 25. 04. 2027

Obmedzenie kapacity železničnej infraštruktúry (2027)



Výlukové rameno: Horná Štubňa – Prievidza					
1	MO	ŽST Sklenné pri Handlovej – ŽST Handlová TK	Komplexná rekonštrukcia (prestavba) MO km 17,943	16 N	09/2027
2	MO	ŽST Handlová – ŽST Chrenovec TK	Komplexná rekonštrukcia (prestavba) MO km 18,726	80 N	09–11/2027
3	MO	ŽST Chrenovec – ŽST Prievidza TK	Súvislá výmena mostníc MO km 0,595	6 N	07/2027
4	OR	ŽST Handlová – ŽST Chrenovec – ŽST Prievidza TK	Komplexná rekonštrukcia koľaje	31 N	01. 07. – 31. 07. 2027

Novinky a zmeny...

- **Výhradná prevádzka ETCS (od 01.01.2031)**
  - ✓ Trate s výhradnou prevádzkou ETCS
  - ✓ Jazda vlaku pri poruche mobilnej časti ETCS
  - ✓ Prípojné stanice na tratiach s výhradnou prevádzkou ETCS
  - ✓ Jazda vlaku do/z prípojných staníc na tratiach s výhradnou prevádzkou ETCS
  - ✓ Jazda vlakov historických vozidiel bez mobilnej časti ETCS
  - ✓ Jazdy vlakov manažéra infraštruktúry
  - ✓ Posun v staniciach



Novinky a zmeny...

- podmienky **rekuperácie** hnacích koľajových vozidiel do elektrických trakčných sietí ŽSR definuje metodický pokyn GR ŽSR,
  - ✓účinný od 21.09.2026;
  - ✓povolené rekuperačné brzdenie **vo všetkých** elektrických trakčných sieťach ŽSR;
- implementácia systému **GSM-R** do siete ŽSR, úsek Varín – Košice – Čierna nad Tisou št.hr. **povolená** (spustenie 30.09.2026)



Novinky a zmeny...

- **Miestne dohovory** podľa „novej filozofie“:
  - ✓so SŽ sú všetky novelizované,
  - ✓s ÖBB-Infrastruktur AG

    DNV – Marchegg od 15.12.2024, BPTA - Kittsee predpoklad od 01.01.2027
  - ✓s PKP PLK S.A. pripravovaná novelizácia
  - ✓s MÁV PM Zrt. a GYSEV Zrt pripravovaná novelizácia



Novinky a zmeny...

- **Sledovanie pracovného času rušňovodičov**
  (technické riešenie + stanovisko MD SR)
- **DP8** Tvorba pomôcok GVD --> Tvorba cestovného poriadku
- **Rozkaz o zavedení GVD**
  - ✓Tabuľka 1 - Vysvetlenie skratiek a značiek pre TCP
  - ✓Tabuľka 2 - Zoznam dopravní s výlukou dopravnej služby
  - ✓Tabuľka 3 - Ustanovenia miestneho významu
  - ✓Tabuľka 4 - Technické hmotnosti a opatrenia pre prevádzku HKV



Novinky a zmeny...

- **Konverzia uzla Žilina (14.09.-28.09.2026):**
  - ✓ styk napájacích sústav ŽST Kysucké Nové Mesto – ŽST Krásno nad Kysucou je vybudovaný v km 261,782 (Kysucké Nové Mesto – Ochodnica zást.),
  - ✓ aktuálne nebude ETCS L2 prenášaná a na HKV zobrazovaná informácia o nutnosti stiahnutia zberača a o zmene trakčného systému -> písomný rozkaz,
  - ✓ so zmenou konfigurácie RBC je počítané pri novej verzii RBC v súvislosti s aktiváciou ETCS v uzle Žilina (r. 2027),
  - ✓ pre toto prechodné obdobie sa riadi návesťami návestidiel pre elektrickú prevádzku v zmysle predpisu ŽSR Z 1;

Novinky a zmeny...

- **Konverzia uzla Žilina (14.09.-28.09.2026):**
  - ✓zmena normatívov vlakov závislej trakcie (TLG 1770/2026, 29.09.2026),
  - ✓v súvislosti s posunutím delenia elektrických trakčných sietí v žilinskom uzle dochádza k dočasnému obmedzeniu železničnej infraštruktúry, s účinnosťou od 28.09.2026 stanovujú tieto limitné hodnoty maximálneho prúdového odberu v časti úseku s jednosmernou elektrickou trakčnou sieťou menovitého napätia 3 kV :
    - 1600 A DC v úseku Kysucké Nové Mesto – Krásno nad Kysucou,
    - 2200 A DC v úseku Varín – Vrútky;
  - ✓regulovať odber prúdu pred týmto úsekom tak, aby nebola prekročená stanovená hodnota najvyššieho prúdu na vlak.

Novinky a zmeny...

- NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) **2026/1184** z 20. mája 2026 **o využívaní kapacity** železničnej infraštruktúry v jednotnom európskom železničnom priestore

Článok 42

Sankcia za zmeny práv na kapacitu

1. Ak si manažér infraštruktúry alebo žiadateľ neplní záväzky týkajúce sa prideleného práva na kapacitu a ak to vedie k zmene zaradenej do kategórie zmien so závažným vplyvom v súlade s článkom 41 ods. 6, zaplatí druhej zmluvnej strane sankciu. Táto sankcia musí byť účinná, primeraná, odrádzajúca a nediskriminačná.



Ďakujem za pozornosť
